

## GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO

# REGLAS DEL EVENTO

1. Los participantes que deseen hacer uso de la palabra deben estar inscritos en las listas de asistencia de ingreso al evento.
2. Iniciando el evento deben tener los celulares en silencio.
3. Las rondas de preguntas se realizaran y se responderán al final de cada exposición por Dirección.
4. Todos tienen derecho a hacer uso de la palabra, la intervención de los participantes deben referirse al punto y máximo solo 2 intervenciones.
5. No deben hacerse alusiones personales.
6. Se debe respetar la opinión de los participantes.
7. Al final del Evento, debemos firmar (Acta de participación).

# RENDICION DE CUENTAS PÚBLICAS FINAL GESTION 2022



Ing. Irineo Flores Martínez  
**ALCALDE MUNICIPAL DE BERMEJO**

# PRESENTACIÓN

En mi condición de Alcalde, del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, tengo a bien presentar, el informe de Rendición Pública de Cuentas Gestión 2022 Final , a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el **Art. 235, inc. 4), Artículo 241, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, Art 141 de la Ley 031 Ley Marco de Autonomías, Así mismo, conforme a la Ley No. 341 de Participación y Control Social art. 37, Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales, Artículo 26 inciso 20 se establece que, la Alcaldesa o el Alcalde Municipal tiene la atribución de presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año.**

El presente Informe refleja todo el trabajo realizado en la gestión 2022, y especialmente los resultados referido a mi gestión desde el mes Enero a Diciembre 2022, ejecutados por las 6 Secretarías Municipales, 12 Direcciones, con sus respectivas jefaturas y responsables de área, acciones programas en el POA y el lineamiento estratégico establecido en el PTDI 2020-2025, y fundamentalmente en la visión Institucional.



## EN LO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SE LOGRO LOS SIGUIENTES RESULTADOS

El Gobierno Autónomo Municipal logra mejorar la credibilidad institucional, gracias políticas de previsión gastos y programación financiera de las cancelaciones de todas las obligaciones adquiridas en la gestión, tanto a proveedores, empresas y sobre todo en la cancelación de los contratos a los consultores individuales de línea, disminuyendo esta manera la deuda a corto y largo plazo.

A pesar de la alta morosidad, aplicación de descuentos y perdonamos en el pago de impuestos, tasas y patentes, se logro una recaudación de recursos propios por **Bs. 14.265.206.-** que corresponde al **62,41%** de los programado, si sumamos las transferencias realizadas por el TGN y otras fuentes de financiamiento externas, se llego a una ejecución de **INGRESOS TOTAL por Bs.- 83.746.176,14.-** que corresponde al **78,01% del presupuesto vigente.**

Mientras que por el lado del gasto se llego a una **EJECUCIÓN DEL GASTO del 74,23%** , del presupuesto vigente, representando una inyección de recursos a la economía de la región de **Bs. 79.692.800,96.-**

En cuanto a las deudas por cobrar, a pesar de la predisposición de la entidad en cancelación de las deudas por el servicio de Energía Eléctrica de los predios Municipales, no tuvimos la misma respuesta de parte de SETAR, que mantiene retenido las recaudaciones por Tasas de alumbrado publico de Ene/Dic por un importe de **Bs. 340,915,57.-** Y por la Tasa de Aseo Urbano por (13 meses), por de **Bs. 1.470.606,33.-**, por la deuda de EMAAB por el consumo de energía eléctrica de las bombas de EMAAB

Al ingresar al Municipio en la gestión 2021, fuimos sorprendido con 22 demanda laborales todas con sentencia ejecutorias, que genero una erogación de recursos por **Bs. 1.809.207,19.-**, con cobros en la mayoría de los casos ilegales, gracia a las instrucciones emitidas y seguimiento, en la gestión 2022, solo se cancelo 7 demanda con sentencia ejecutoriada por un importe de Bs. **272.250,96.-** sobre las 22 demandas canceladas en la gestión 2021, se esta a la espera del informe de auditoria para luego de ello iniciar las acciones de repetición a los mismos y a los servidores públicos que no asumieron defensa en su momento.

Conjuntamente las organizaciones sociales, se gestiono ante el Ministerio de Gobierno la Dotación de 2 vehículos livianos para apoyar a las diferentes divisiones de la Policia FELCC

## TRABAJANDO POR UNA REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA

Estamos buscando dar solución al problema del agua para la producción, dentro de este propósito, se firmo un acuerdo con UCEP – MI RIEGO Unidad Técnica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para la elaboración **2 Estudios de Diseño Técnicos de Pre inversión** (Riego Comunidad El Toro y Riego Comunidad Cañadón Buena Vista).

En este mismo propósito, después de 4 años, en la gestión 2022, se logra contar con la aprobación por parte de la delegación Argentina, para la ejecución del proyecto de Riego PORCELANA Y CAMPO GRANDE, CONSTRUCCIÓN , actualmente esta en la priorización de la inversión para la gestión 2023, que permitirá **Regar mas de 2,517 ha.**

Luego de 5 años de ejecución de proyectos productivos financiados por el FDI, en la gestión 2021 y 2022, se procedió a cierre de 3 proyectos con el FDI, quedando pendiente de cierre, el proyecto APOYO A LA PRODUCCION CAÑA AZUCAR.

Se firmo convenio con el FDI con una inversión de **Bs. 2.461,484,66.-** para la ejecución del proyecto «APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA COMERCIAL EN 6 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEV BERMEJO» que beneficiara a **100 familias con una superficie de 75 ha.** en ejecución

Se firmo Convenio con el MDRyT – Programa IPDSA "PRODUCCIÓN Y POST COSECHA (D) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE HORTALIZAS, esta programado su ejecución en la gestión 2023

En la gestión 2022, se firma CONVENIO con el MMAyA – FONABOSQUE, con una inversión de **Bs. 1.165.457,74**, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DEFENSIVOS NATURALES RIVERA DEL RIO BERMEJO, Para beneficiar a **5 comunidades con 208 ha. Reforestadas.**

En base al acuerdo marco con la Fundación VISION MUNDIAL: se tiene programado trabajar en la implementación de "HUERTOS HORIZONTALES AREA URBANA"

Después de 2 años de restricciones por la pandemia del COVID-19, se reactiva el programa de Ferias Artesanas y Productivas en las diferentes comunidades, con la realización de 5 Ferias productivas, que tienen como objetivo promover las actividad económicas en las comunidades y hacer conocer el potencial productivo en diferentes rubros. (**Feria de Cítricos Comunidad Candado Grande; Del Duraznos en Comunidad Santa Rosa; Del Pescado en Naranja Dulce; Del Pacú en Los Pozos y la Feria Campesina del 2 de Agosto**)

Con el programa de Fortalecimiento al Sector productivo se procedió a la Dotación de Semillas a los productores de hortalizas y otros, así mismo como compensación por los efectos climáticos adverso, se aprobó el apoyo gratuito con maquinaria agrícola a los productores afectados por las heladas, en una cantidad **de 50 ha. En 3 Comunidades, Flor de Oro, los Pozos y Cañadón B. Vista**



### TRABAJAMOS POR LA SALUD Y BIENESTAR PARA TODOS

Dentro la prioridad que venimos dando al sector salud, en la gestión 2022, se contrato por 11 meses a **52 médicos y paramédicos, 29 administrativos y 24 técnicos en vectores y abatizadores**, haciendo un total de **105 Contratos Municipales, para el SECTOR SALUD**, distribuidos en los 14 establecimientos de primer nivel, fue el primer años en los últimos 10 años, que no se tuvo personal médicos y paramédicos, sin contratos por mas de 1 mes, se canceló oportunamente los salarios, solo quedo pendiente de pago el mes de Diciembre/22.

Se gestiono ante el Ministerio de Salud de **10 ítem de médicos y paramédicos** para los Centros de Salud del Primer Nivel y 1 Ítem de Medico para el Tercer Nivel

El nivel de abastecimiento de Medicamentos, reactivos e insumos en los 14 establecimientos de primer nivel, se mantuvo en un nivel del 94%, de abastecimiento, como en ningún año las farmacias estuvieron oportunamente abastecidas.

Se gestiono ante el Ministerio de Salud la dotación de medicamentos, material de bioseguridad y reactivos por un valor aproximado de **Bs 2,000,000.-** significando un gran aporte a la Salud por el Gobierno Nacional.

Para garantizar un servicio de Salud de calidad, se entrego equipamiento al Centro de Salud Distrito 4 San José por un importe de **Bs. 1.314,830,-** (1 Equipo Rayo X estacionario, 1 Ecógrafo Estacionarios, 1 Esterilizador, 1 Microscopio, 1 Doopler Fetal de Mano y 1 Sillón Odontológico)

Se entrego equipamiento **para los 14 establecimientos de Salud** de Primer Nivel (Heladeras, Esterilizadores, Instrumental Menor y de y equipo de Computación).

Se gestiono ante el Ministerio de Salud y Deporte la Dotación de Equipamientos de oxinoterapia para COVID-19, consistente en 3 unidades generadores de oxigeno, 6 unidades Axiometros pediátricos con sensor, 20 axiometros con sensor para adulto, 350 unidades de mascarillas con bolsas, por un total de **Bs. 110,340.-**

Se firma convenio con el Ministerio de Salud y Deportes para fortalecimiento con equipamientos para los establecimiento de primer nivel; se procede a la entrega de 1 Electrocardiógrafo, y 1 equipo ecógrafo, por un importe total de **Bs. 231,900,-**

Se llevo adelante con un rotundo existo la primera FERIA DE LA SALUD CON MAS 10.000 ATENCIONES EN ESPECIALIDADES Y MAS DE 20.000 ATENCIONES EN DIFERENTE PROGRAMAS DEL MIN. SALUD.

Se cumplió el compromiso con todo el distrito 1, la **Construcción del Cierre Perimetral** del Centro de Salud, lo que permitió a fines de Diciembre viabilizar la inauguración del nuevo Centro del Distrito 1.

Después de mas de 1 años de espera, se procedió a la inauguración oficial del **Nuevo Centro de Salud Distrito 1**, se instalaron los servicios básicos, aceras de circulación y mobiliarios, hoy la población disfruta de la comunidad de un centro que reúne las condiciones de salud.

Después de muchos años de incomodidad productos de las filtraciones de agua por el techo, Se atendió el requerimiento del personal medico del centro de Salud Moto Méndez y Autoridades locales, se **construyo un sobre techo** que soluciona defensivamente las filtraciones de agua.

## LA EDUCACION DE CALIDAD ES LA BASE DEL DESARROLLO DE UN PUEBLO

Se garantizo la entrega de la Alimentación Complementaria a **9.533 alumnos de forma diaria, durante 160 días** de clases, el producto sobrante fue distribuidos a las diferentes direcciones de las 43 unidades educativas, también se contrato 37 manipuladoras para la preparación de alimentos en el área rural y se entrego menajes de cocina.

Se garantizo recursos económicos para la atención de 12 RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, desde y hacia los diferentes establecimientos educativos del campo, **297 alumnos beneficiados**

Con la finalidad de cubrir el déficit de docentes, se procedió a la contratación 11 docentes como consultores individuales de línea y 17 personal administrativos

Se cumplió con la dotación anual de material de limpieza, de escritorio e insumos de bioseguridad para los diferentes establecimientos educativos, también se entrego indumentaria deportiva par el campeonato inter núcleo.

Al inicio de la gestión se construyó el sobre techo del módulo 1 de la Unidad Educativa 25 de Mayo, sobre la calle Beni y calle Gualberto Villarroel

Al finalizar la gestión con los recursos adicionales, se pudo dar solución al problema de goteras en el techo de la Unidad Educativa de la Colonia Linares con la Construcción de un sobre techo para toda la unidad.

De igual forma con los recursos adicionales se pudo dar solución al problema de goteras en el techo de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, con la Construcción de un sobre techo para una parte de la infraestructura

Se firmó convenio con la Fundación VISION MUNDIAL: "MEJORAMIENTO BATERIAS DE BAÑO CANDADO GRANDE, PORCELANA, BARREDERO Y ARROZALES

Se firmó Convenio con la Fundación VISION MUNDIAL: para construcción de "SALAS DE ESTIMULACION TEMPRANA CANDADO GRANDE, PORCELANA, BARREDERO Y ARROZALES

Se realizó el mantenimiento y ampliación de la cámara de vigilancia en las diferentes unidades educativas.

Se dio el realce necesario al aniversario del CENTENARIO DE BERMEJO, con la realización de diferentes actos protocolares y actos culturales en el mes de Agosto, con anuncios y entregas de importantes proyectos para Bermejo.

## INCLUSION SOCIAL, IGUALDAD Y JUSTICIA

Se gestiono ante Lotería Nacional y el Ministerio de la Presidencia UE-FNSE, 25 Ayudas Técnicas para mejorar la calidad de vida de 25 personas con capacidades diferentes.

A través del equipo de Valoración de UMAPDIS, se tramitaron y entregaron 187 carnet de discapacidad en la gestión 2022

Se dio cumplimiento Resolución Ministerial N° 1028 incorpora el Complemento Nutricional CARMELO en la Ley N° 475 del SUS, Complemento que proporciona nutrientes que son necesarios para alcanzar un adecuado estado nutricional, mejorando la calidad de vida en el adulto mayor. Se tiene programado la entrega de 10.110 unidades.

Se dio cumplimiento a la Ley 977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica para personas con Discapacidad con el pago del Bono de Discapacidad del Mes Dic/21 y de Enero a Noviembre/22 (12 MESES) con **3.190 asignaciones canceladas por un valor de Bs. 797,500.- en promedio se cancelo el bono a 265 personas por mes.**

Se firmo Convenio con la UPRE: para la ejecución en la gestión 2023 la "CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS VULNERABLES EN SITUACION DE VIOLENCIA - BERMEJO" con una inversión de **Bs. 9.397.342,26**, que permitirá dar acogida y atención a los diferentes grupos vulnerables.

## SERVICIOS BASICOS y A. PUBLICO

Se mejoro la eficiencia de la Planta de tratamiento de Agua de EMAAB del Barrio Víctor Paz, con la Construcción de canal de decantación, floculación y dosificación de químicos.

Se Adquirió una Bomba Sumergible de **80 l/s** para EMAAB, con lo que se garantizo el bombeo de 115 l/s. de Agua a las 2 plantas, también se entrega **33,750 kg. De sulfato de aluminio y 816 Kg Cloro Gas** para el tratamiento de Agua.

En la Gestión 2022, se firmo convenio con el FPS para la ejecución del proyecto MEJ. SIST. AGUA POTABLE COLONIA JOSE MA. LINARES (BERMEJO), con una inversión de **Bs. 2,407,687,99.-** que beneficiara a **300 familias** de la Comunidad.

Ante el desabastecimiento de agua en las diferentes Comunidades y Barrios Periféricos de la Ciudad, se gestiono ante Defensa Civil, el apoyo de **2 Cisterna de 15 mil y 10 mil Litros**

En Diciembre se concluyo el proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico con la instalación de **2.159 pantallas LED**, en calles, paseo publico y campos deportivos con una inversión Total de **Bs. 7,447,22,72.-** teniendo una mejora sustancial en la imagen de la ciudad, generando condiciones para la apertura de diferentes actividades de servicios en horas de la noche, además de mejorar la seguridad de los ciudadanos.

## MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

Se da prioridad a la continuidad de los proyectos de Construcción unidades educativas, Aulio Araoz, U.E. Barretero y U.E 8 de Septiembre, financiado bajo convenio con la Gobernación de Tarija, como también de la U.E. Simón Bolívar financiado por la UPRE

Se dio continuidad a la Construcción del proyecto Mercado Abasto Bermejo bajo convenio con la UPRE

Por administración Directa se priorizo, la CONTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE UNA (1) CUADRA EN LA CALLE GERMAN BUSCH

Se firmo CONVENIO FPS por un importe de **Bs. 2.850.648,55.-** para la "CONSTRUCCION DE ADOQUINADO URB. BARRIO EL PORVENIR« programa Bol-34, próximamente se firmar 2 nuevos convenio, para construcción de Adoquinado Barrio YPFB y Adoquinado Comunidad de Barrederos

En la gestión 2022, Se firmo un nuevo CONVENIO con la UPRE por un importe de **Bs. 11.825.696,49.-** para la "**CONST. MODULO TECNOLOGICO TECNICO HUMANISTICO – BERMEJO – TARIJA**, se tiene programado inicio de Obra para el mes de Marzo.

En la gestión 2022, Se firmo un nuevo CONVENIO con la UPRE por un importe de **Bs. 9.397.342,26.-** para la "**CONST. CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS VULNERABLES EN SITUACION DE VIOLENCIA – BERMEJO.**



## RECREACION Y DEPORTE

Las anterior gestión dejo una deudas de mas de 44 mil por energía eléctrica del Estadio Municipal, de acuerdo a Compromiso con la asamblea de deporte, se cancelo esta deuda y se habilito para uso nocturno previo compromiso de pagar por la Luz

También pudimos habilitar las canchas de pelota Raqueta frontón del multideportivo, para la gestión 2023, comprometemos la habitación de la cancha de Raque ball y el cierre perimetral del Multideportivo.

Con el proyecto de Alumbrado Publico, se ilumino 6 canchas de futbol (Comunidad Barredero, cancha YPFB, Cancha barrio petrolero, Cancha 27 de Mayo, cancha 1 de Mayo y Cancha San Antonio

Se reabrieron las escuelitas Municipales de Deporte, después de 3 años, con la contratación de 13 instructores

Se entrego material deportivo y de premiación a 9 disciplinas deportivas

## OTRAS GESTIONES DE COOPERACIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIAS

Gestión ante el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) de quinientas **(500) bolsas** de cemento para áreas afectadas por inundaciones

gestión ante el viceministerio de defensa civil (videci) de doscientas **(200) horas/máquina** para beneficiar 4 comunidades afectadas por riada e inundación, y en gestión se tiene comprometido **400 hrs/máquina adicionales**

Finalmente debo manifestar mis agradecimiento a las diferentes instituciones y a las organizaciones sociales por su apoyo comprometido con el desarrollo de nuestro Municipio, lo que nos compromete a seguir trabajando por el bienestar de nuestro vecinos y vecinas. Muchas gracias.

Ing. Irineo Flores Martínez  
**ALCALDE MUNICIPAL DE BERMEJO**

**BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS CIUDADANOS,  
GESTIONAMOS LA APROBACION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS Y OTROS QUE  
ESTAN EN GESTION DE FINANCIAMIENTO**

<b>PROYECTOS NUEVOS APROBADOS</b>							
N°.	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.	INFRAEST. TRANF TENOLOGICA BS.	SUPERVISION, FISCALIZ. Y AUDITORIA Bs.	DECOM y CAPACIT	EQUIP.	TOTAL INVERSION
	ACCION - OBJETO - LOCALIZACION						
1	PRESER. TERRENOS CON DEFENSIVOS NATURALES DE AMENAZA DE INUNDACION RIVERAS DE RIO BERMEJO MUNICIPIO BERMEJO	DES. PROD.	942.266,74	30.000,00	193.191,00		1.165.457,74
2	APOYO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA COMERCIAL EN 6 COMUNIDADES DEL MCPO. DE BJO.	DES. PROD.	1.511.557,50	226.068,16	63.759,00	660.100,00	2.461.484,66
3	PRODUCCIÓN Y POST COSECHA (D) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE HORTALIZAS,	DES. PROD.	460.000,00				460.000,00
4	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COLONIA JOSE MA. LINARES (BERMEJO)	SEC. TEC.	1.575.147,50	177.188,45			1.752.335,95
5	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO PORVENIR - FASE I	SEC. TEC.	2.741.008,22	109.640,33			2.850.648,55
6	CONST. MODULO TECNOLOGICO TECNICO HUMANISTICO BERMEJO - TARIJA	SEC. TEC.	11.103.940,38	721.756,11			11.825.696,49
7	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS VULNERABLES EN SITUACION DE VIOLENCIA - BERMEJO	SEC. TEC.	8.823.795,56	573.546,70			9.397.342,26
	<b>TOTAL PROYECTOS APROBADOS</b>		<b>27.157.715,90</b>	<b>1.838.199,75</b>	<b>256.950,00</b>	<b>660.100,00</b>	<b>29.912.965,65</b>

**PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	RESP.	INFRAEST. TRANF TENOLOGICA BS.	SUPERVISION, FISCALIZ. Y AUDITORIA Bs.	DECOM y CAPACIT	EQUIP.	TOTAL INVERSION
	ACCION - OBJETO - LOCALIZACION						
1	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS DISTRITO 6, 7, 8 Y 9 MCPO. DE BJO.	DES. PROD.	332.174,85	20.968,17	18.010,00	6.779.230,08	7.150.383,10
2	IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE MANI MUNICIPIO DE BERMEJO - TARIJA	DES. PROD.	2.596.862,08	343.735,15		6.059.255,55	8.999.852,78
3	PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS EN LA MICRO CUENCA EL NUEVE - MUNICIPIO BERMEJO	MED. AMB.	3.656.971,67	270.000,00	595.018,07		4.521.989,74
4	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO COMUNIDAD BARREDERO	SEC. TEC.	2.746.547,76				2.746.547,76
5	CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO YPFB	SEC. TEC.	2.841.682,32	113.667,29			2.955.349,61
6	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS PRODUCTIVOS MCPO. DE BJO.	SEC. TEC.				6.944.656,00	6.944.656,00
7	CONSTRUCCION SISEMA DE RIEGO COMUNIDAD PORCELANA (BEMEJO)	SEC. TEC.	23.366.628,98	936.643,55	753.415,72		25.056.688,25
8	AMPLIACION ALCATARILLADO SANITARIO BARRIO PERIURBANOS MUNICIPIO DE BERMEJO	SEC. TEC.	6.277.670,60	313.883,53	251.106,82		6.842.660,95
9	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO MUNICIPAL CIUDAD DE BERMEJO	SEC. TEC.	2.769.258,38	124.616,63			2.893.875,01
10	CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO CENTRAL BERMEJO	SEC. TEC.	77.730.892,03	3.886.544,60			81.617.436,63
	<b>TOTAL GESTION FINANCIAMIENTO</b>		<b>122.318.688,67</b>	<b>6.010.058,91</b>	<b>1.617.550,61</b>	<b>19.783.141,63</b>	<b>149.729.439,82</b>

# **INFORME DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS AL 31/DIC/2022**

## RESUMEN PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-22

FTE	ORG.	DESCRIPCIÓN CAT. PRG.	PART. (%)	PRESUP. INICIAL	MOD. APROB.	PRESUP. VIG.	REC. PERCIB.	NO PERCIBIDO	EJC FIN. %
20	210	REC. ESP. PROPIOS	21,29	22.448.799,00	409.952,31	22.858.751,31	14.064.269,29	6.982.960,12	61,53
20	230	OTROS REC. ESP. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,40	-10.841,40	-
41	111	TRANSF. TGN UPRE	10,55	73.578,00	11.255.010,47	11.328.588,47	7.917.225,91	3.411.362,56	69,89
41	113	TRANSF. COOP. TRIBUTARIA	30,62	23.778.101,00	9.093.106,21	32.871.207,21	28.079.851,26	4.791.355,95	85,42
41	119	TRANSF. IDH	21,87	14.789.022,00	8.693.158,68	23.482.180,68	21.405.580,52	2.076.600,16	91,16
41	120	TRANSF. P. JUEGOS	0,01	0,00	6.009,33	6.009,33	0,00	6.009,33	0,00
41	121	TRANSF. PAT. PETROLERA	1,19	0,00	1.273.359,98	1.273.359,98	982.361,18	290.998,80	77,15
42	220	TRANSF. GOB TJA REGALIAS	7,30	5.188.321,00	2.652.770,18	7.841.091,18	4.236.200,65	3.604.890,53	54,03
43	314	TRANSF. C. EXT. - FPS CAF	1,00	0,00	1.071.077,00	1.071.077,00	563.764,10	507.312,90	52,64
43	732	TRANSF. C. EXT. - FPS BEI	0,46	0,00	499.512,00	499.512,00	485.719,07	13.792,93	97,24
87	230	TRANSF. D. INT. - FONABOSQUE	0,25	0,00	265.477,00	265.477,00	265.477,00	0,00	100,00
92	230	PRESTAMOS - FNDR	5,46	0,00	5.858.613,64	5.858.613,64	5.734.885,76	123.727,88	97,89
		<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>66.277.821,00</b>	<b>41.078.046,80</b>	<b>107.355.867,80</b>	<b>83.746.176,14</b>	<b>21.798.169,76</b>	<b>78,01</b>

**EJEC FINANCIERA DE INGRESOS  
S/PRESUP. VIGENTE AL 31-DIC-22**


**78,01%**

# **INFORME DE GASTOS 31/DIC/2022**


## PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTOS POR GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PART. % EJEC	DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MOD. APROBADAS	PRESUP. VIG.	EJECUCIÓN DEL GASTO	PORC EN.
12,64	GASTO CORRIENTE	10.490.005,00	1.016.832,37	11.506.837,37	10.072.888,94	87,54
42,85	PROGRAMAS RECURRENTES	38.249.031,00	10.557.110,06	48.806.141,06	34.151.442,58	69,97
31,80	INVERSION PUBLICA	7.149.714,00	28.370.384,56	35.520.098,56	25.339.260,59	71,34
12,71	DEUDA PUBLICA	10.389.071,00	1.133.719,81	11.522.790,81	10.129.208,85	87,91
<b>100,00</b>	<b>TOTALES</b>	<b>66.277.821,00</b>	<b>41.078.046,80</b>	<b>107.355.867,80</b>	<b>79.692.800,96</b>	<b>74,23</b>

**DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL TIPO DE GASTO AL 31 DIC DEL 2022**

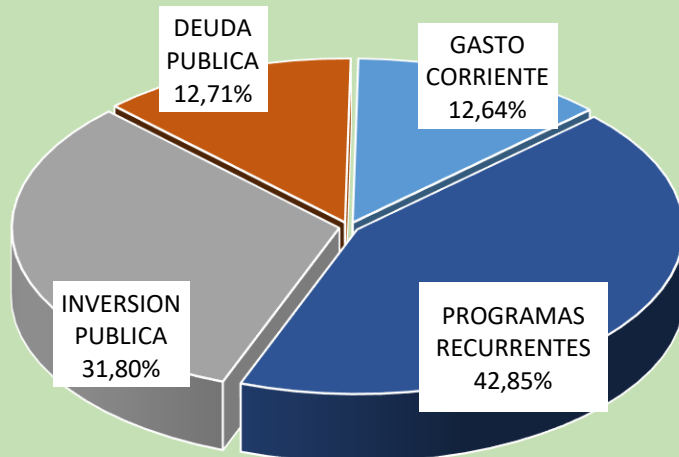

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO A DICIEMBRE GESTION 2022**

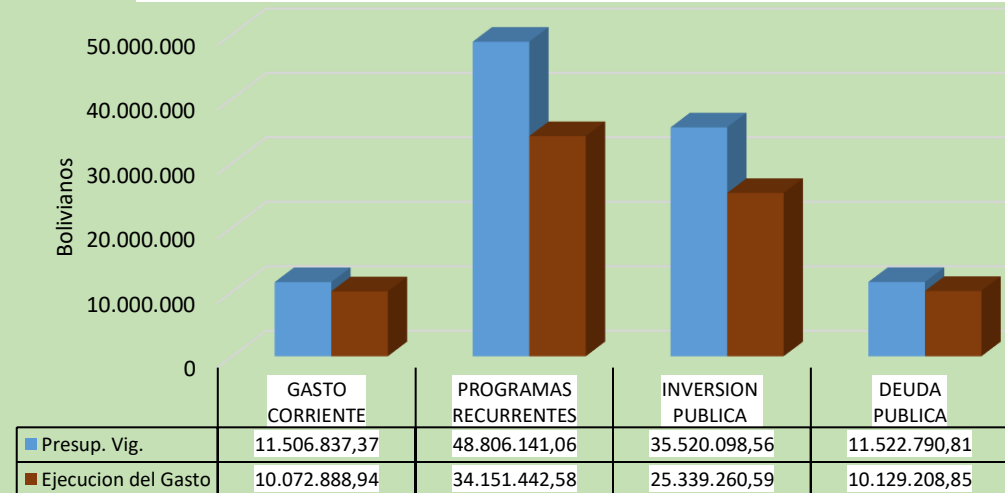




## PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR SECRETARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PART. %	SECRETARIAS	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Ejecución del Gasto	%
25,90	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21.144.090,00	2.431.651,53	23.575.741,53	20.640.447,44	87,55
1,78	SECRETARIA DESARROLLO PROD. Y M. AMB.	2.115.662,00	3.403.348,06	5.519.010,06	1.419.043,90	25,71
21,73	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	17.126.967,00	4.463.636,12	21.590.603,12	17.316.582,97	80,20
39,92	SECRETARIA TECNICA	16.633.171,00	26.326.855,23	42.960.026,23	31.811.511,65	74,05
0,12	SECRETARIA JURIDICA	129.099,00	0	129.099,00	92.266,73	71,47
1,10	SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO	977.046,00	121.124,83	1.098.170,83	876.470,65	79,81
7,29	OTROS PROGRAMAS GASTOS Y TRANSF	6.356.287,00	4.296.159,03	10.652.446,03	5.808.673,83	54,53
2,17	CONCEJO MUNICIPAL BERMEJO	1.795.499,00	35.272,00	1.830.771,00	1.727.803,79	94,38
<b>100,00</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO POR SECRETARIA</b>	<b>66.277.821,00</b>	<b>41.078.046,80</b>	<b>107.355.867,80</b>	<b>79.692.800,96</b>	<b>74,23</b>

### PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCION DEL GASTO POR SECRETARIAS - AL 31 DE DICIEMBRE 2022

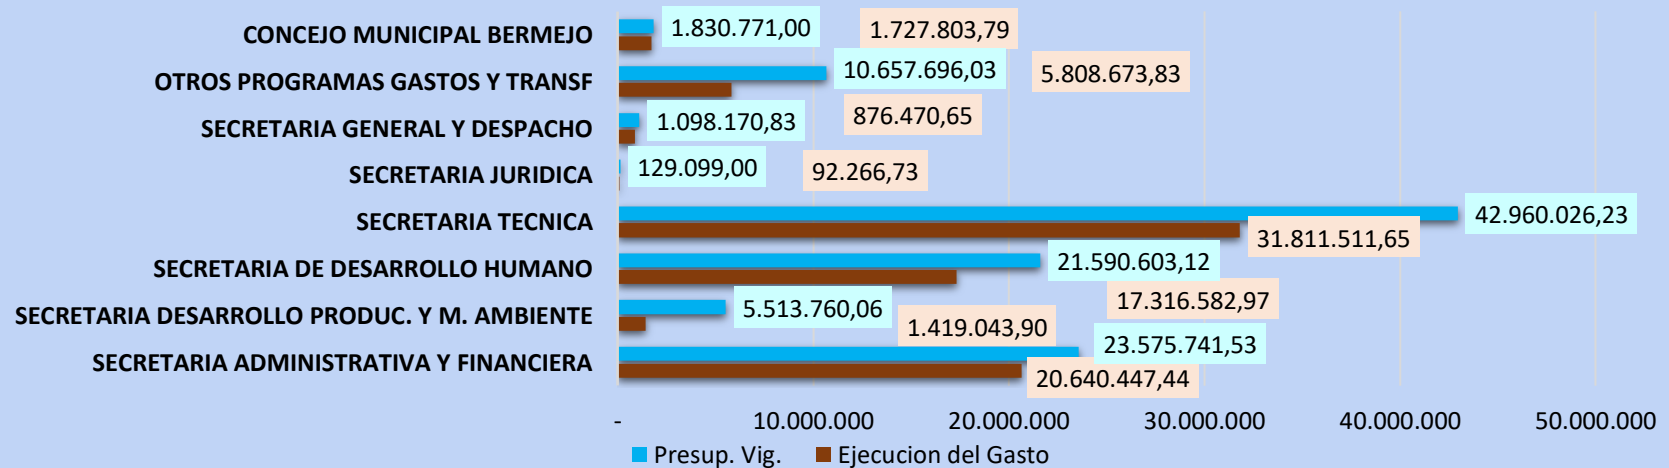

# PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTOS POR FUENTE Y ORGANISMO AL 31/12/2022

Fte.	Org.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vigente	Ejecución del Gasto	Porcen.
20	210	REC. ESPECIFICOS PROPIOS	22.448.799,00	409.952,31	22.858.751,31	16.089.033,66	70,38
41	111	TRANSF. TGN UPRE	73.578,00	11.255.010,47	11.328.588,47	7.545.812,91	66,61
41	113	TRANSF. COOP. TRIBUTARIA	23.778.101,00	9.093.106,21	32.871.207,21	26.514.991,96	80,66
41	119	TRANSF. IDH	14.789.022,00	8.693.158,68	23.482.180,68	16.223.368,60	69,09
41	120	TRANSF. P. JUEGOS	0,00	6.009,33	6.009,33	0,00	0,00
41	121	TRANSF. PATENTE PETROLERA	0,00	1.273.359,98	1.273.359,98	823.493,57	64,67
42	220	TRANSF. GOB TJA REGALIAS	5.188.321,00	2.652.770,18	7.841.091,18	5.531.653,33	70,55
43	314	TRANSF. C. EXTERNOS - FPS CAF	0,00	1.071.077,00	1.071.077,00	563.764,10	52,64
43	732	TRANSF. C. EXTERNOS - FPS BEI	0,00	499.512,00	499.512,00	485.719,07	97,24
87	230	TRANSF. D. INTERNA - FONABOSQUE	0,00	265.477,00	265.477,00	56.779,77	21,39
92	230	PRESTAMOS - FNDR	0,00	5.858.613,64	5.858.613,64	5.858.183,99	99,99
			<b>66.277.821,00</b>	<b>41.078.046,80</b>	<b>107.355.867,80</b>	<b>79.692.800,96</b>	<b>74,23</b>



PRESUPUESTO INICIAL LEY N°193/21 Y PGE N°1413/21	66.277.821,00	DESTINO RECURSOS
<b>REGISTRO DE MODIFICACIONES APROBADAS POR EL MEFP</b>		
MODIFICACION MEFP PROYECTOS FPS - CAF	491.077,00	SIST. AGUA POTABLE CAÑADON BUENA VISTA (BJO) Y COLONIA LINARES
MODIFICACIÓN MEFP PROYECTOS FPS - BCO EUROPEO	499.512,00	PROYETOS SIST. AGUA LOS POZOS Y PORCELANA - FPS
MODIFICACION FDI	987.049,63	PROGRAMA DE IMP. LABOTARIO DE CAÑA
MODIFICACIONES MEFP PROYECTOS FINANCADOS UPRE	8.595.637,79	PROYECTOS SIMPON BOLIVAR Y MERCADO ABASTO
MODIFICACION REGISTRO SALDO CAJA Y BANCO GESTION 2021	8.186.510,35	DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
MODIFICACION REGISTRO CREDITO FNDR - ALUMBRADO PUB.	3.680.832,64	DESEMBOLSO PARCIAL CREDITO FNDR A. PUBLICO
MODIFICACION ADICIONAL PATENTES PETROLERAS	12.968,65	RECURSOS ADICIONALES SALDO GESTION 2021
MODIFICACION FDI	660.100,00	PRODUCCION PAPA EN 6 COMUNIDADES-INVERSION
MODIFICACION FDI	902.512,53	97-0-050 "TRANSFERENCIA FDI"
MODIFICACION REGISTRO DE ANTICIPO FINANCIEROS	2.153.145,00	DIFERENTES PROYECTOS
MODIFICACIÓN MEFP PROYECTOS FPS - CAF	580.000,00	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COLONIA JOSE MA. LINARES (BERMEJO)
MODIFICACION MMAyA	427.480,66	FOREST. Y REFORESTACION EN LA MICRO CUENCA RIO BJO.
MODIFICACION MEFP GASTO POR LEY (N° 031)	1.047.278,00	ADMINISTRACION MUNICIPAL BERMEJO
MODIFICACION MEFP GASTO POR LEY (D.S. N° 859)	8.134,00	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA
MODIFICACION MEFP GASTO POR LEY (LEY N° 3791)	1.220.107,00	RENTA DIGNIDAD
MODIFICACION MEFP GASTO POR LEY SUS (N° 1152)	649.312,00	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS
MODIFICACION MEFP	3.824.235,53	PROVISION GASTOS CAPITAL
MODIFICACION MEFP	2.477.004,00	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO
MODIFICACION MEFP UPRE	2.231.892,02	CONST. MODULO TECNOLOGICO TECNICO HUMANISTICO BJO. - TARIJA
MODIFICACION MEFP FONABOSQUE	265.477,00	PRESER. TERRENOS CON DEFENSIVOS NAT. DE AMENAZA DE INUNDACION
MODIFICACION REGISTRO CREDITO FNDR - ALUMBRADO PUB.	2.177.781,00	2DO DESEMBOLSO PARCIAL CREDITO FNDR A. PUBLICO
<b>TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO</b>	<b>41.078.046,80</b>	
<b>VARIACION DEL PRESUPUSTO % (INCREMENTO)</b>	<b>61,98%</b>	
<b>PRESUPUESTO AL 31-12-2022</b>	<b>107.355.867,80</b>	



# **SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

## **RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS**

# DIRECCION DE INGRESOS



## TERMINAL DE BUSES



Nº	MESES	BAÑOS PUBLICOS	USO DE TERMINAL	ALQUILERES DE CASSETAS
1	ENERO	2.800,00	16.000,00	10.196,00
2	FEBRERO	2.640,00	11.200,00	4.341,00
3	MARZO	2.660,00	14.400,00	1.283,00
4	ABRIL	3.040,00	14.400,00	825,50
5	MAYO	3.080,00	16.000,00	9.106,00
6	JUNIO	2.640,00	12.800,00	14.488,00
7	JULIO	4.160,00	19.200,00	9.592,00
8	AGOSTO	4.080,00	17.600,00	11.751,50
9	SEPTIEMBRE	4.240,00	16.000,00	6.471,50
10	OCTUBRE	4.080,00	14.400,00	1.659,00
11	NOVIEMBRE	3.840,00	12.800,00	6.225,00
12	DICIEMBRE	4.480,00	12.800,00	20.740,00
<b>TOTAL</b>		<b>41.740,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>96.678,50</b>

**TOTAL ACUMULADO: 316.018,50 Bs.**

## CEMENTERIO GENERAL




**RECAUDACION POR "CONCESION  
DE SITIO" EN CEMENTERIO  
MUNICIPAL - GESTION 2022  
(Expresado en Bolivianos)**

Nº	MESES	MONTO
1	ENERO	5.030,00
2	FEBRERO	6.322,00
3	MARZO	6.857,00
4	ABRIL	11.327,00
5	MAYO	24.019,00
6	JUNIO	20.407,00
7	JULIO	15.849,50
8	AGOSTO	14.637,00
9	SEPTIEMBRE	20.884,00
10	OCTUBRE	37.932,00
11	NOVIEMBRE	18.114,00
12	DICIEMBRE	36.208,00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>		<b>217.586,50</b>

## PUENTE INTERNACIONAL

### RECAUDACION POR FUMIGADO DE VEHICULOS - GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	8.598,00
2	FEBRERO	13.218,00
3	MARZO	12.128,00
4	ABRIL	15.421,00
5	MAYO	15.831,00
6	JUNIO	12.645,00
7	JULIO	12.728,00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>		<b>90.569,00</b>



### RECAUDACION PUENTE INTERNACIONAL "PEAJE MUNICIPAL" GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	3.612,00
2	FEBRERO	3.962,00
3	MARZO	2.422,00
4	ABRIL	5.040,00
5	MAYO	4.312,00
6	JUNIO	4.760,00
7	JULIO	3.941,00
8	AGOSTO	11.140,00
9	SEPTIEMBRE	12.890,00
10	OCTUBRE	18.670,00
11	NOVIEMBRE	16.460,00
12	DICIEMBRE	19.590,00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>		<b>106.799,00</b>

**TOTAL ACUMULADO: 197.348,00 Bs.**

**NOTA.-** El cobro de FUMIGADO a partir de mes de Agosto fue suspendido por determinaciones del COEM.



## INTENDENCIA MUNICIPAL



### RECAUDACION DE BAÑO PUBLICO "MERCADO BOLIVAR" - GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	2.208,00
2	FEBRERO	1.368,00
3	MARZO	2.309,00
4	ABRIL	1.972,00
5	MAYO	2.436,00
6	JUNIO	2.079,00
7	JULIO	2.200,00
8	AGOSTO	3.118,00
9	SEPTIEMBRE	2.234,00
10	OCTUBRE	2.888,00
11	NOVIEMBRE	2.354,00
12	DICIEMBRE	1.743,20
<b>TOTAL RECAUDACION</b>		<b>26.909,20</b>

### RECAUDACION DE BAÑO PUBLICO "MERCADO CENTRAL" - GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	2.016,00
2	FEBRERO	2.577,20
3	MARZO	3.151,00
4	ABRIL	2.860,00
5	MAYO	2.746,00
6	JUNIO	3.636,00
7	JULIO	3.264,80
8	AGOSTO	2.989,60
9	SEPTIEMBRE	3.764,00
10	OCTUBRE	3.152,00
11	NOVIEMBRE	3.864,00
12	DICIEMBRE	3.412,00
<b>TOTAL RECAUDACION</b>		<b>37.432,60</b>

**TOTAL ACUMULADO: 64.341,80 Bs.**

# INTENDENCIA MUNICIPAL



## RECAUDACION POR USO DE ESPACIO PUBLICO "CANHAJE" - GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	21.758,40
2	FEBRERO	18.480,00
3	MARZO	23.520,00
4	ABRIL	22.403,00
5	MAYO	22.480,00
6	JUNIO	25.203,00
7	JULIO	28.160,00
8	AGOSTO	26.000,00
9	SEPTIEMBRE	31.120,00
10	OCTUBRE	30.080,00
11	NOVIEMBRE	28.733,00
12	DICIEMBRE	32.215,80
<b>TOTAL RECAUDACION</b>		<b>310.153,20</b>

## RECAUDACION POR USO DE ESPACIO PUBLICO "PARQUEO DE VEHICULOS" - GESTION 2022 (Expresado en Bolivianos)

Nº	MESES	IMPORTE
1	ENERO	0,00
2	FEBRERO	0,00
3	MARZO	2.065,00
4	ABRIL	10.900,00
5	MAYO	7.200,00
6	JUNIO	11.112,00
7	JULIO	9.040,00
8	AGOSTO	6.800,00
9	SEPTIEMBRE	9.120,00
10	OCTUBRE	20.560,00
11	NOVIEMBRE	7.600,00
12	DICIEMBRE	9.200,00
<b>TOTAL RECAUDACION</b>		<b>93.597,00</b>

**TOTAL ACUMULADO: 403.750,20 Bs.**

**NOTA.-** El cobro de PARQUEO DE VEHICULOS empezó a mediados del mes marzo, por la asignación del nuevo personal.

## RECURSOS PROPIOS – GESTION 2022

<b>RECAUDACION CON RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>		
<b>Nº</b>	<b>MESES</b>	<b>TOTAL</b>
1	ENERO	684.604,20
2	FEBRERO	464.212,60
3	MARZO	487.391,10
4	ABRIL	864.802,30
5	MAYO	1.568.988,80
6	JUNIO	1.241.467,40
7	JULIO	1.195.240,67
8	AGOSTO	1.409.741,10
9	SEPTIEMBRE	1.279.761,50
10	OCTUBRE	1.307.007,00
11	NOVIEMBRE	1.063.832,07
12	DICIEMBRE	1.904.961,00
<b>TOTAL RECAUDADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</b>		<b>13.472.009,74</b>



# **SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**




# **ACTIVIDADES**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
000 0 001	ADMINISTRACION MUNICIPAL BERMEJO	8.764.506,00	1.026.560,37	9.791.066,37	8.431.616,79	86,12

## Gasto de Funcionamiento

- Cancelación de 1 planilla del mes de Diciembre de la gestión 2021 y 12 planillas de Sueldos, Salarios y Aguinaldo de la gestión 2022, a los 94 funcionarios de planta del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo.
- Se realizo los pagos de Asignaciones familiares a 9 beneficiarios del personal de planta.
- Se realizo la cancelación de Beneficios Sociales a 5 personas que se retiraron.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
034 0 023	CANCELACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS	0,00	272.250,96	272.250,96	272.250,96	100,00

**GESTION 2021**

**CONTINGENCIAS JUDICIALES GESTION 2021**

DETALLE	TOTAL PAGADO
LEY MUNICIPAL AUTONOMA LEY 186/2021	854.182,57
LEY MUNICIPAL AUTONOMA LEY 197/2021	955.024,61
<b>TOTAL PAGADO A 22 PERSONAS POR BS.</b>	<b>1.809.207,18</b>

**GESTION 2022**

**CONTINGENCIAS JUDICIALES GESTION 2022**

N°	FECHA DE CANCELACION	PREV.	BENEFICIARIO	TOTAL PAGADO
1	29/03/2022	565.1.1.1	BENJAMIN CHAVEZ FLORES	18.613,00
2	27/05/2022	1188.1.1.1	DIANDRA PORCEL QUIROGA	13.640,00
3	22/09/2022	2076.1.1.1	RAMIRO ROMERO CARDOZO	17.572,00
4	22/09/2022	2077.1.1.1	PAOLA VERONICA RENGIFO	9.076,69
5	14/11/2022	2533.1.1.1	TERESA JURADO RAMOS	95.924,00
6	05/12/2022	2935.1.1.1	ISAIAS QUISPE BAEZ	7.425,27
7	30/12/2022	3086.1.1.2	RENAN LOPEZ MEJIA Y RENE GONZALO ROMERO	110.000,00
<b>TOTAL PAGADO BS.</b>				<b>272.250,96</b>

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
034 0 026	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	1.990.513,00	-879,61	1.989.633,39	1.807.370,84	90,84

- ❖ Cancelación de sueldos a consultores de línea por un monto de Bs. 614.144,60 pertenecientes a la Secretaria Administrativa y Financiera.
- ❖ Compra de materiales y suministros, para el desarrollo de las tareas ejecutadas por cada unidad.
- ❖ Cancelación de servicios básicos por concepto de energía eléctrica dependencias del GAMB, internet y agua, como así también se pago de gestión 2021 y hasta noviembre del 2022.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
099 0 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO	1.752.741,00	478.505,58	2.231.246,58	1.732.977,63	77,67

OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRES. EJEC.	CONCEPTOS
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	998.253,44	Cancelación de sueldos devengados del personal permanente del G.A.M.B. correspondiente a Octubre/2020 y Abril/2021
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	19.875,00	Cancelación por la compra de materiales y suministros realizadas por el Concejo
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	25.455,56	Retenciones impositivas
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	689.393,63	Cancelación de Beneficios Sociales a funcionarios jubilados
<b>TOTAL BS</b>		<b>1.732.977,63</b>	





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
099 0 002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ( INVERSION)	8.636.330,00	655.214,23	9.291.544,23	8.396.231,22	90,36

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRES. EJECUTADO	CONCEPTOS
6.1.1	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	5.637.095,25	Cancelación de 6 Créditos con el F.N.D.R. haciendo un total de Bs. 6.670.386,54
6.1.2	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	965.585,87	
6.1.3	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	67.705,42	
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	981.477,52	Cancelación de sueldos devengados de consultores en línea de todas las Unidades del G.A.M.B., servicios básicos

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRES. EJECUTADO	CONCEPTOS
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	200.977,33	Cancelación por la compra de materiales y suministros realizados por las diferentes Unidades pertenecientes a cada una de las Secretarías del G.A.M.B.
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	496.973,23	Cancelación por compra de Activos Fijos, planillas de avance de obras de diferentes proyectos.
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	36.416,60	Retención por Multas y Faltas, a consultores en línea y proveedores para pago de acreedores
	<b>TOTAL BS.</b>	<b>8.396.231,22</b>	





# **SECRETARIA JURÍDICA**

## **ACTIVIDADES**

N°	CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
1	034 0 009	FORTALECIMIENTO DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	129.099,00	0,00	129.099,00	92.266,73	71,47

DETALLE	N° CASOS
PROCESOS LABORALES EJECUTORIADOS <b>GESTION 2021</b> (NO CASACION) SE CANCELO UN MONTO DE <b>BS. 1.809.207,19.-</b>	22
PROCESOS LABORALES EJECUTORIADOS <b>GESTION 2022</b> (SI HUBO DEFENSA) SE CANCELO UN MONTO DE <b>BS. 272.250,96</b>	7
PROCESOS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCION, INGRESADOS ENTRE 2019, 2020 Y 2021	98
PROCESOS LABORALES INGRESADOS EN LA GESTION 2022	32
PROCESOS EN CASACION	0
PROCESOS EN APELACION EN LA CIUDAD DE TARIJA	11
PROCESOS CONTENCIOSOS CON EMPRESAS Y PROVEEDORAS	21
PROCESOS PENALES PENDIENTES DE RESOLUCION	11
PROCESOS COACTIVOS FISCALES	1
ACCIONES CONSTITUCIONALES	8

# **SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE**



## **ACTIVIDADES**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 001	PROMOCION FERIAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO DE BJO.	112.920,00	0,00	112.920,00	80.207,00	71,03


### ACTIVIDAD:

- 1 **FERIA EXPOSICIÓN DE CÍTRICOS Y SUS DERIVADOS (CANDADO GRANDE)**
- 2 **FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL, CULTURAL Y DEPORTIVA CAMPESINA (MERC. 2 DE AGOSTO)**
- 3 **FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL DEL PESCADO EN LA COMUNIDAD DE NARANJO DULCE.**
- 4 **FOMENTO A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO (SANTA ROSA)**
- 5 **I FERIA DEL PACU EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 009	FORT. DIREC,DESAR.PROD. ( FORTAL. Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO )	550.667,00	0,00	550.667,00	240.448,27	43,66

**CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y CULTIVO DE HUERTAS HORIZONTALES.**



**DOTACIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ A COMUNARIOS DE CAÑADÓN BUENA VISTA, CABECERA 9, ALTO CALMA, SAN LUIS EL ANTA, VILLA NUEVA, BARREDERO, COLONIA LINARES**



**APOYO CON 80 SOBRES DE SEMILLA DE TOMATE VARIEDAD TINTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS INSECTICIDAS 74 LITROS DE LORTES PLUS, 74 LITROS DE LUXOR Y FUNGICIDAS 74 KILOS DE RAM CAF 74 KILOS DE DITHANE**



**FIRMA DE CONVENIO INTERGUBERNATIVO DEL PROYECTO “APOYO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA COMERCIAL EN 6 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERMEJO”**



**FIRMA DE CONVENIO INTERGUBERNATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PRODUCCIÓN Y POST COSECHA (D) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE HORTALIZAS**



**PRESENTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE PROYECTO “PROTECCIÓN DE LOS TERRENOS CON DEFENSIVOS NATURALES DE LA AMENAZA DE INUNDACIÓN DE LAS RIVERAS DEL RIO BERMEJO EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO”.**





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 010	( FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE MECANIZACION AGRICOLA BJO. )	323.500,00	-16.560,53	306.939,47	179.736,60	58,56

ACCIONES	PRODUCTO
TRABAJO DE RASTREADO, SURCADO Y ARADO ,	376,25 HAS CULTIVADAS
TRASLADO DE AGUA EN CISTERNA REMOLCABLE JALADO A TRACCIÓN CON TRACTOR AGRÍCOLA.	80.000 LTS DISTRIBUIDOS
APOYO A ÁREAS VERDES, TRASLADO HERRAMIENTAS, PLATINES, MALEZA, RESTOS DE PODA, TEPES.	48 VIAJES

TRASLADO DE AGUA EN CISTERNA REMOLCABLE PARA SOFOCACIÓN DEL INCENDIO	30.000 LTS «COMUNIDAD, EL 5, CANDADO CHICO, SANTA ROSA, ETC.
--	--

### INGRESO GENERADO POR LA MAQUINARIA AGRÍCOLA GESTIÓN 2022

MESES	TOTAL HA's	TOTAL INGRESOS
ENERO	0,00	0,00
FEBRERO	19,50	3.900,00
MARZO	49,00	10.150,00
ABRIL	42,25	8.900,00
MAYO	45,25	10.300,00
JUNIO	20,50	5.100,00
JULIO	8,25	1.800,00
AGOSTO	5,50	1.400,00
SEPTIEMBRE	32,50	7.650,00
OCTUBRE	78,00	19.500,00
NOVIEMBRE	55,00	13.850,00
DICIEMBRE	20,50	5.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>376,25</b>	<b>87.650,00</b>



APOYO GRATUITO POR AFECTACION DE LAS HELADAS	FECHA
ROMPLOW 1 HECTAREA POR PERSONA	NOVIEMBRE A DICIEMBRE

- COMUNIDAD «FLOR DE ORO» 15 HECTÁREAS
- COMUNIDAD «CAÑADON BUENA VISTA» 20 HECTÁREAS
- COMUNIDAD «LOS POZOS» 15 HECTÁREAS

**50 ha. trabajadas gratuitas listas para cultivo  
por un valor aprox. de Bs. 10.000**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
013 0 001	FORTALECIMIENTO UNIDAD AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	333.449,00	-17.000,00	316.449,00	287.784,20	90,94

### PRODUCCION DE PLANTINES VIVERO MUNICIPAL ARROZALES



### ORNAMENTACIÓN PLAZA NARCISO CAMPERO



#### ACTIVIDADES:

- SE REALIZÓ EL DESMALEZADO Y LIMPIEZA 302 INTERVENCIONES EN DIFERENTES PLAZAS PLAZUELAS PARQUES Y AVENIDA Y OTRAS ÁREAS DE RECREACIÓN.
- PRODUCCIÓN DE 7.800 PLANTINES ORNAMENTALES DE BORDURA Y FORESTALES.
- 2 PLAZAS ORNAMENTADAS CON ESPECIES DE BORDURA E IMPLEMENTACIÓN DE CANTEROS Y MACETEROS, COMO COLOCACIÓN DE ORNAMENTOS DE FERROCEMENTO
- PINTADO DE 3 PLAZAS ÁREA RURAL (BARREDERO, COLONIA LINARES Y PORCELANA)
- ORNAMENTACIÓN Y PODA PLAZA COM. COLONIA LINARES
- PODA DE ÁRBOLES EN CALLES DE 8 BARRIOS DE LA CIUDAD.
- PODA DE ÁRBOLES ACERAS PERIMETRALES DE 12 UNIDADES EDUCATIVAS.
- PODA DE ÁRBOLES DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE PANTALLAS NUEVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
013 0 003	FORTALECIMIENTO DIRECCION MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	186.401,00	-4.120,00	182.281,00	78.199,20	42,90

ACCIONES	PRODUCTO
REFORESTACIÓN CON ESTUDIANTES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS Y NIÑOS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO	300 PLANTAS
ELABORACIÓN DE FORMULARIO DE NIVEL DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL Y PRESENTACIÓN A LA AACD.	7 LICENCIAS AMBIENTALES
SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN AMBIENTAL A IAB S.A, CUMPLIMIENTO PPM-PASA DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL 2021, 1 INSPECCION REALIZADA CON LA AACD.	2 INSPECCIONES
MONITORIO DE AGUA RÍOS BERMEJO Y RIO TARIJA CON LA OTN,	1 INFORME
MONITOREO DE EMANACIONES Y POSIBLE CONTAMINACIÓN POR DERRAME DE PETRÓLEO CON VERIFICACIÓN DE 3 PUNTOS (YPFB, TECNICOS DEL GAMB Y CONCEJO MUNICIPAL).	1 INFORME
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS (PAPEL, CARTÓN, BOTELLAS PET, VIDRIOS, NYLON), POR 3 GRUPOS RECICLADORES EMPRENDEDORES	280 TONELADAS
CONVENIO CON LA DIRECCION DISTRIITAL Y EL GAMB PARA FOMENTAR EL RECICLAJE EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 9 AREA URB- 3 AREA RURAL	4.942 KILOS

### REFORESTACION CANCHA BARRIO 1RO DE MAYO



### SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE USO RACIONAL DEL AGUA A ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS



**APOYO PARA PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, CON FUNDACIÓN NATURA, EMAAB Y EL GAMB, EN LAS COMUNIDADES VILLA NUEVA Y LA FLORIDA.**

**35 MEDICIONES DE RUIDO A FUENTE FIJAS (DISCOTECAS Y ZUMBAS) Y 2 CAMPAÑAS MOVILES**

**INSPECCIÓN A PARCELAS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR : RIADA-INUNDACION, FUMAGINA, HELADA, INCENDIOS FORESTALES Y SEQUIA.**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
013 0 006	OBRAS Y ACTIV. EN AREAS DE APROV. P/EXTRACCION DE ARIDOS LEY 3425	196.800,00	-84.000,00	112.800,00	9.306,00	8,25

**COORDINACIÓN E INSPECCIÓN CON AUTORIDADES COMUNALES EN RIBERAS DE LOS RÍOS BERMEJO Y TARIJA PARA VERIFICAR SI CORRESPONDE LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y AGREGADOS.**



**APOYO ADICIONAL CON 32 HORAS/MAQUINA PARA CANALIZACIÓN Y DESVIACIÓN DEL RIO EN LA COM. PORCELANA CON EQUIPO DEL GAM BERMEJO TRACTOR ORUGA DISTANCIA DE 700 MTS. LARGO X 20 MTS. ANCHO, APROXIMADAMENTE, SE DISPUSO 1.018 LTS. DE COMBUSTIBLE A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE RR. NN.**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
031 0 001	FORTALECIMIENTO UNIDAD DE GESTION DE RIESGO	78.012,00	180.000,00	258.012,00	192.075,40	74,44

ACTIVIDADES	UNIDAD	EJEC.
CURSO DE CAPACITACION CON BOMBERO FORESTAL	CURSO	2
CURSO TALLER DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES "EDAN"	CURSO	2
TALLERES DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS UNIDADES EDUCATIVAS	TALLER	1
ATENCIÓNES DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (INCENDIO)	EVALUACION ATENCION	1
ATENCIÓNES DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (RIADA, INUNDACION, FUMAGINA, SEQUIA)	EVALUACION ATENCION	4
CURSOS DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	CURSOS	2
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CURSOS	2
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN COORDINACIÓN CON TECNICOS DE LA OTN DE RIO BERMEJO Y RIO GRANDE TARIJA	MONITOREO	1
EVALUACION DE ZONAS EN RIESGO AREA URBANA	MAPEO	1
INSPECCION DE VIVIENDAS SOCIALES AREA URBANA	INSPECCIONES	9
INSPECCION DE VIVIENDAS SOCIALES AREA URBANA Y AREA RURAL EN COORDINACION CON TECNICOS DE LA AE VIVIENDA ESTATAL	INSPECCIONES	8
INSPECCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN REFACCION Y AMPLIACION DE VIVIENDAS SOCIALES	INSPECCIONES	8



# **COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 200 HORAS MAQUINARIA POR PARTE DE VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL**

**COMUNIDADES  
BENEFICIADAS CON HORAS  
MAQUINA:**

<b>COMUNIDADES</b>	<b>HORAS/ MAQUINA</b>
<b>NARANJITOS</b>	<b>60</b>
<b>CAMPO GRANDE</b>	<b>50</b>
<b>PORCELANA</b>	<b>50</b>
<b>ISLA EL HORIZONTE</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL HORAS/MAQUINA</b>	<b>200</b>

**TRABAJOS DE  
DRAGADO-  
CANALIZACION  
HORAS MAQUINA:  
200 HORAS  
MONTO  
INVERSION: Bs.  
89.600.00**



# **SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE**



## **PROYECTOS**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 005	APOYO A LA PRODUCCION _DE CAÑA DE_ AZUCAR_ PARA LA IMPLEMENTACION TECNOL.	62.980,00	1.681.136,71	1.744.116,71	0,00	0,00

<b>FINANCIAMIENTO</b>	FDI: 2.467.624,07 GAMB: 157.200,00 BENEF: 167.589,36 <b>TOTALES: 2.792.413,43</b>
<b>COMPONENTES</b>	A: INVERSION FISICA 2.373.918,90 B: CAPITAL DE TRABAJO 197.589,36 C: INVERSION DIFERIDA 220.905,17 <b>TOTAL: 2.792.413,43</b>
<b>EMPRESA CONSTR.</b>	ASOC. ACCIDENTAL TRIANGULO & ASOCIADOS
<b>MONTO DE OBRA</b>	<b>BS. 749.857,00 - 100%</b>
<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	SELECON INGENIERÍA EN SERVICIOS
<b>MONTO SUPERVISIÓN</b>	<b>BS. 89.281,30 - 100%</b>
<b>EQUIPAMIENTO</b>	EN PROCESO DE LICITACIÓN
<b>MONTO</b>	<b>BS. 1.527.233,07</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
<b>ESTADO ACTUAL</b>	EN EJECUCIÓN
<b>AVANCE FÍSICO PROYECTO</b>	<b>54 % EN EJECUCION</b>
<b>EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON FECHA LÍMITE HASTA EL 07 DE ABRIL DE LA GESTIÓN 2023, DE ACUERDO A ADENDA N° 4, Y EN PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO (EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, INSUMOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO).</b>	

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 006	PRODUCCION DE CITRICOS_ EN SEIS COMUNIDADES_ DEL MUNICIPIO DE BERMEJO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

<b>FINANCIAMIENTO</b>	FDI	BS. 1.000.000,00
	GAMB	BS. 67.000,00
	BENEF	BS. 0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>BS. 1,067,000,00</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 DE JUNIO DE 2018	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	365 DÍAS, AMPLIADO 132 DÍAS = 497 DÍAS	
<b>FECHA FINALIZ CONVENIO</b>	24 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>ESTADO ACTUAL</b>	CONCLUIDO TODOS COMPONENTES + AUDITORIA <b>EJECUCION FINANCIERA 100 %</b>	
<b>AVANCE FÍSICO PROYECTO</b>	<b>100 % CONCLUIDO Y EN CIERRE DE CONVENIO</b>	
<b>RESULTADOS:</b> DOTACIÓN DE 45.353 PLANTINES A 133 FAMILIAS BENEFICIARIAS CADA UNA CON 1 HECTÁREA DE PLANTACIÓN DE 3 VARIETADES DE CÍTRICOS EN 6 COMUNIDADES (CAÑADÓN B. VISTA, VILLANUEVA, LA FLORIDA, SANTA ROSA, CABECERA EL NUEVE Y EL NUEVE) DEL MUNICIPIO.		

**GASTOS : CANCELACIÓN DE RETENCIÓN DEL 7%**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 007	APOYO A LA PROD. PISCICOLA EN LAS COMS LOS POZOS, NARANJO DULCE, CAND.CHICO Y PORC.	44.830,00	230.909,94	275.739,94	196.131,34	71,13

<b>FINANCIAMIENTO</b>	FDI	BS.	986.446,60
	GAMB	BS.	1.037.140,95
	BENEF	BS.	30.000,00
	<b>TOTALES</b>	<b>BS.</b>	<b>2.053.587,55</b>
<b>COMPONENTES</b>	A.- COSTO INVERSION FIJA	BS.	1.704.422,38
	B.- CAPITAL DE TRABAJO	BS.	172.260,00
	C.- COSTO INVERSION	BS.	176.905,17
	<b>TOTALES</b>	<b>BS.</b>	<b>2.053.587,55</b>
<b>FECHA DE INICIO CONVENIO</b>	14 DE JUNIO DE 2018		
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	540 DÍAS, AMPLIACIÓN 870 DIAS = 1,410 DIAS		
<b>FECHA DE FINALIZ CONVENIO</b>	24 DE ABRIL 2022		
<b>ESTADO ACTUAL</b>	<b>EN PROCESO DE CIERRE</b>		
<b>AVANCE FÍSICO PROYECTO</b>	<b>100 % EN EJECUCION</b>		
<b>PRODUCCIÓN DE PACÚ, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ALEVINES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 30 ESTANQUE BENEFICIANDO A 60 FAMILIAS DEL MUNICIPIO, TAMBIÉN SE CUMPLIÓ CON SUS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE BIENES E INSUMOS QUÍMICOS, CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE EXCAVACIÓN DE ESTANQUES Y COLOCADO DE GEOMEMBRANAS DEL PROYECTO Y SE REALIZO LA 1RA SIEMBRE DE ALEVINES DE 17.010 ALEVINES.</b>			

**APOYO CON MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE PORCELANA, LOS POZOS Y NARANJO DULCE.**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 0 008	ASPOYO PRODUCCION CULTIVO PALTO EN CINCO COMUNIDADES MUNICIPIO BERMEJO	33.000,00	72.574,28	105.574,28	42.308,46	40,07

<b>FINANCIAMIENTO</b>	FDI GAMB <u>BENEF</u> <b>TOTALES</b>	BS. 1.847.571,15 BS. 261.751,00 BS. 48.000,00 <b>BS. 2.157.322,15</b>
<b>COMPONENTES</b>	A.- COSTO INVERSION FIJA B.- SEGUIMIENTO Y CONTROL <u>C.- ASISTENCIA TECNICA</u> <b>TOTAL</b>	BS. 1.803.530,00 BS. 199.171,15 <u>BS. 154.621,00</u> <b>BS. 2.157.322,15</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	04 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	365 DÍAS + 251 DÍAS Y 162 DÍAS PARALIZACIÓN P/PANDEMIA +455 ADENDA = 1071 DÍAS	
<b>FECHA DE FINALIZ CONVENIO</b>	20/04/2023	
<b>ESTADO ACTUAL</b>	EN PROCESO DE CIERRE	
<b>AVANCE FÍSICO PROYECTO</b>	<b>100 % CONCLUIDO</b>	
<b>EL PROYECTO CONTEMPLA LA DOTACIÓN DE 27.600 PLANTINES DE PALTO (5 VARIETADES), CON INSUMOS Y CAPACITACIÓN, IMPLEMENTANDO 66.40 HAS., BENEFICIANDO A 134 PRODUCTORES EN 5 COMUNIDADES (VILLANUEVA, EL TORO, CANDADO GRANDE, Q. CHICA, EL CINCO). ADICIONALMENTE SE ENTREGÓ 2.500 PLANTINES PARA REPOSICIÓN EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CON UN AVANCE DE UN 100 % DE ENTREGAS.</b>		



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
010 1603002290 0000 000	APOYO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA COMERCIAL EN 6 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERMEJO	0,00	660.100,00	660.100,00	0,00	0,00

DESCRIPCION	COSTO TOTAL Bs.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		FDI	GAMB	BENEF.
<b>A. COSTOS DE INVERSION FIJA</b>	<b>660.100,00</b>	<b>660.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.- Bienes y Equipamiento	660.100,00	660.100,00	0,00	0,00
<b>B. CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>1.511.557,50</b>	<b>1.181.557,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
1.- Mano de Obra	285.000,00	0,00		285.000,00
2.- Materia Prima e Insumos	1.181.557,50	1.181.557,50		0,00
3.- Servicios	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>C. COSTOS DE INVERSION DEFERIDA</b>	<b>289.827,16</b>	<b>111.608,16</b>	<b>178.219,00</b>	<b>0,00</b>
1.- Capacitación y Asistencia Técnica	63.759,00	0,00	63.759,00	0,00
3.- Supervisión	111.608,16	111.608,16	0,00	0,00
4.- Fiscalización	71.460,00	0,00	71.460,00	0,00
5.- Auditoria Externa	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.461.484,66</b>	<b>1.953.265,66</b>	<b>223.219,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>TOTAL %</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,35%</b>	<b>9,07%</b>	<b>11,58%</b>



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
013 1603002260 0000 000	PRESER. TERRENOS CON DEFENSIVOS NATURALES DE AMENAZA DE INUNDACION RIVERAS DE RIO BERMEJO MUNICIPIO BERMEJO	0,00	265.477,00	265.477,00	56.779,77	21,39

COMPONENTE	TOTAL BS.	FONABOSQUE	G.A.M.B.
<b>COMPONENTE 1</b> INFRAESTRUCTURA	310.119,60	310.119,60	0,00
<b>COMPONENTE 2</b> PRODUCCIÓN DE PLANTINES FORESTALES	414.547,14	203.015,00	211.532,14
<b>COMPONENTE 3</b> FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MUROS VERDES.	217.600,00	123.480,00	94.120,00
<b>COMPONENTE 4</b> FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA	42.005,00	39.005,00	3.000,00
ADMINISTRACIÓN	151.186,00	106.824,00	44.362,00
AUDITORIA	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL BS</b>	<b>1.165.457,74</b>	<b>812.443,60</b>	<b>353.014,14</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>69,71%</b>	<b>30,29%</b>



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
013 16030021800000	FOREST. Y REFORESTACION EN LA MICRO CUENCA RIO BJO.	193.103,00	427.480,66	620.583,66	56.067,66	9,03


<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>PNC- MMayA BS. 994.009,61</b> <b>GAMB BS. 367.647,39</b> <b>TOTALES BS. 1.361.657,00</b>
<b>COMPONENTES</b>	<b>1.- CAPACITACION Y SEGUIMIENTO</b> <b>2,- PLANTACION FORESTAL</b> <b>3,- FORT. VIVERO MUNICIPAL</b> <b>4,- <u>PROT.Y FORESTACION DE VERTIENTES</u></b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>30 DE MAYO DE 2018</b>
<b>FECHA DE FINALIZ CONVENIO</b>	<b>31-06-23</b>
<b>ESTADO ACTUAL</b>	<b>EN EJECUCION</b>
<b>AVANCE FÍSICO</b>	<b>54,95 %</b>
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	<b>51,00%</b>

**ENTREGA DE PLANTINES FRUTALES Y CAPACITACIONES TEÓRICAS A COM. FLOR DE ORO Y LOS POZOS**





# SECRETARIA TÉCNICA



## ACTIVIDADES

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 0 008	SERVICIO DE AGUA, SANEAMIENTO BASICO Y RIEGO	1.419.248,00	-275.900,38	1.143.347,62	581.587,32	50,87



- **Adquisición de Bomba Sumergible y su tablero con un monto de 169.600,00 Bs. De una capacidad de 80 litros/segundo para EMAAB con recursos del G.A.M.B.**
- **Adquisición de químicos para tratamiento de agua – EMAAB 268.335,00.**
- **Actualización del Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio Periurbano con un monto de 40.000,00 bs., cuyo proyecto asciende a 6.8 millones de bolivianos.**
- **Mantenimiento de los pozos con un monto de 20.000,00 Bs. (Barrio San Bernardo y San Juan)**
- **Adecuación y complementación canal de distribución de Agua Potable y construcción de Caseta química Barrio Víctor Paz por un monto de 67.200,32 Bs., para mejorar la eficiencia de la planta de agua Potable.**

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD ( KG)	P.U. (KG)	MONTO BS.
1	SULFATO DE ALUMINIO AL 17%	33.750,00	6,50	219.375,00
2	GAS CLORO 99,8%	816,00	60,00	48.960,00
<b>TOTAL BS.</b>				<b>268.335,00</b>



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
14 0 001	FORTALECIMIENTO ADM. ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO R.SOLIDOS	1.856.979,00	0,00	1.856.979,00	1.357.282,17	73,09

**DE LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA CIUDAD.**

Nº	VEHICULOS	DETALLE	TN/DÍA	TN/MES	TN/AÑO
1	COMPRESOR 01	RESIDUOS DOMICILIARES	8	240	2.880
2	COMPRESOR 02	RESIDUOS DOMICILIARES	8	240	2.880
3	COMPRESOR 03	RESIDUOS DOMICILIARES	8	240	2.880
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	<b>720</b>	<b>8.640</b>

**DE UNIDADES EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA Y OTROS.**

Nº	VEHÍCULOS	DETALLE	TN/DÍA	TN/MES	TN/AÑO
1	CANTER	UNIDADES EDUCATIVAS, HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA, TERMINAL DE BUSES, CAJA NACIONAL, CEMENTERIO GENERAL AV./S PRINCIPALES Y OTROS.	3	90	1.080
2	VOLQUETA	SECTOR AV. PETROLERA, UNIDADES EDUCATIVAS, MERCADO MOTO MÉNDEZ, PRO MUJER, CENTROS DE SALUD Y OTROS PUNTOS.	7	210	2.520
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>300</b>	<b>3.600</b>

**TOTAL RECOLECCION DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO GESTION 2022**

Nº	DETALLE	TN/DÍA	TN/MES	TN/AÑO
1	DOMICILIARES	24	720	8.640
2	UNID. EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, HOSPITAL VIRGEN CHAGUAYA, MERCADO, SECTOR AV. PETROLERA, URB. PORVENIR, COM. PORCELANA Y OTROS PUNTOS.	10	300	3.600
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>1.020</b>	<b>12.240</b>

MES	TOTAL RECAUDACIÓN	COMISIÓN 3% SETAR	SALDO A DEPOSITAR 97%
ENERO	105.660,00	3.169,80	102.490,20
FEBRERO	95.093,00	2.852,79	92.240,21
MARZO	134.393,00	4.031,79	130.361,21
ABRIL	107.231,00	3.216,93	104.014,07
MAYO	115.669,00	3.470,07	112.198,93
JUNIO	114.540,00	3.436,20	111.103,80
JULIO	111.957,00	3.358,71	108.598,29
AGOSTO	133.174,00	3.995,22	129.178,78
SEPTIEMBRE	121.198,00	3.635,94	117.562,06
OCTUBRE	119.562,00	3.586,86	115.975,14
NOVIEMBRE	116.357,00	3.490,71	112.866,29
DICIEMBRE	122.954,00	3.688,62	119.265,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.397.788,00</b>	<b>41.933,64</b>	<b>1.355.854,36</b>




### NOTA:

**SETAR NO TRANSFIERE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 POR BS. 114.751,97 Y EN LA GESTIÓN 2022 ENERO A DICIEMBRE POR BS. 1.355.854,36 HACIENDO UN TOTAL DE BS. 1.470.606,33, NO TRANSFERIDOS QUE PONE EN RIESGO LA SOSTENIBILIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO.**

**RECAUDACIÓN POR EL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS EN MERCADOS, FERIAS Y OTROS.**

MES	MERCADO BOLÍVAR	MERCADO MOTO MÉNDEZ	AV. PETROLERA	FERIA DOMINICAL	OTROS	TOTAL
ENERO	1.266,00	969,00	559,00	1.188,00	160,00	4.142,00
FEBRERO	1.610,00	1.330,00	560,00	952,00	196,00	4.648,00
MARZO	2.030,00	1.831,00	630,00	1.220,00	215,00	5.926,00
ABRIL	2.030,00	2.100,00	700,00	1.400,00	1.105,00	7.335,00
MAYO	1.471,00	1.540,00	560,00	1.260,00	240,00	5.071,00
JUNIO	1.540,00	1.540,00	560,00	1.190,00	1.150,00	5.980,00
JULIO	1.610,00	1.680,00	560,00	1.400,00	1048,00	6.298,00
AGOSTO	1.330,00	1.470,00	490,00	1.330,00	1.470,00	6.090,00
SEPTIEMBRE	1.680,00	1.890,00	560,00	1.330,00	1.205,00	6.665,00
OCTUBRE	1.610,00	1.610,00	490,00	1.400,00	1.240,00	6.350,00
NOVIEMBRE	1.330,00	1.680,00	420,00	910,00	1.055,00	5.395,00
DICIEMBRE	1.083,00	1.596,00	324,00	652,00	3.122,00	6.777,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.697,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>6.439,00</b>	<b>14.232,40</b>	<b>12.206,00</b>	<b>70.894,40</b>

**LAS TRABAJADORAS DE AYUDANTES DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO REALIZAN LA LIMPIEZA, BARRIDO MANUAL DE PRADOS, PLAZAS, PLAZUELAS, JARDINERAS AV. CIRCUNVALACIÓN, PASEO LOS CHAGUANCOS, AV. PETROLERA, ETC.) DE LA CIUDAD.**

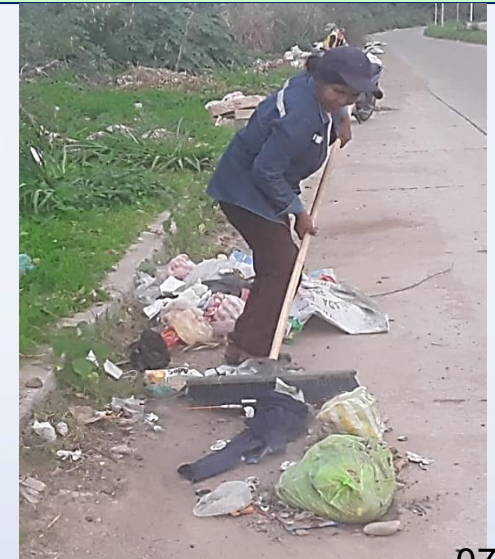

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 0 004	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA	150.000,00	-18.724,62	131.275,38	104.564,13	79,65

ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.
ELABORACIÓN ESTUDIOS PROYECTOS (EDTP)	9
ELABORACIÓN ESTUDIOS OBRAS MENORES	14
FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS	9
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	4
REVISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO, CONTRATO MODIFICATORIO	10
INFORME DE PLANILLAS DE AVANCE PROYECTOS	71
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS	8
ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA	4



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 0 005	MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	3.020.807,00	-531.032,17	2.489.774,83	1.942.134,68	78,00

## OBRAS CIVILES

Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL
2	MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD ÁREA URBANA Y CENTROS DE SALUD ÁREA RURAL
3	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MERCADOS
4	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS
5	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
6	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
7	PROYECTOS QUE SE TIENE PROGRAMADO AL PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO MUNICIPAL





## ALUMBRADO PUBLICO

Nº	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	REPARACIONES DE 20 PANTALLAS EN AFUERAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS.
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 296 PANTALLAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 92 PANTALLAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
4	REPARACION DE 20 PANTALLAS Y REFLECTORES EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS.
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 PANTALLAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE BERMEJO



**PROYECTO CONSTRUCCION CORDONES Y ACERAS  
EN EL MERCADO MUNICIPAL ABASTO POR UN  
MONTA DE 94.399,38 BS.**



**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL  
FRONTIS CENTRO DE SALUD DISTRITO 1  
POR UN MONTO DE 99.949,00 BS.**



**CONSTRUCCION SOBRE TECHO CENTRO DE  
SALUD MOTOMENDEZ POR UN MONTO DE  
61.477,43 BS.**



## FEM FOMENTO AL EMPLEO MUNICIPAL

### CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MANUALES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE 24 PERSONAS CON CARGO AL GASTO DE SERVICIOS MANUALES.

CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN LÍNEA.

SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 2 CONSULTORES EN LÍNEA PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA. TÉCNICO SUPERVISOR: PARA EL SEGUIMIENTO DEL PERSONAL, PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS. CHOFER DE LA VOLQUETA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y PERSONAL SERVICIOS MANUALES



N°	ACTIVIDADES
1	LIMPIEZA DE LAS RIVERAS DEL RIO BERMEJO
2	LIMPIEZA DE SEDIMENTOS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL ÁREA URBANA
3	DESMALEZADO DE 14 UNIDADES EDUCATIVAS ÁREA URBANA
4	DESMALEZADO DE 12 UNIDADES EDUCATIVAS ÁREA RURAL
5	DESMALEZADO DE 7 CENTROS CENTIRES DEL ÁREA URBANA
6	DESMALEZADO DE 4 CENTROS CENTIRES DEL ÁREA RURAL
7	DESMALEZADO DE 7 CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA
8	DESMALEZADO DE 3 CENTROS DEPORTIVOS
9	LIMPIEZA DE 2 QUEBRADAS DEL ÁREA URBANA
10	LIMPIEZA DE LAS BOCATORMENTAS DEL ÁREA URBANA
11	VACIADO DE 80 M2 ACERAS ÁREA URBANA
12	VACIADO DE 120 MTS CORDONES ÁREA URBANA
13	VACIADO DE 152 M3 CALLE GERMAN BUCH
14	COLOCADO DE 1500 M2 DE LOSETAS B. 27 DE MAYO , B. PETROLERO Y B 21 DE DIC.
15	LIMP. DE 500M TUBERÍAS DE AGUA EN COMUNIDAD EL NUEVE
16	LIMPIEZA DE 15 INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN ANIVERSARIOS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA
17	LIMPIEZA DE 4 INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN ANIVERSARIOS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL
18	APOYO A DESCHATARRIZACION EN 2 OPORTUNIDADES EN BARRIOS DEL ÁREA URBANA

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
18 0 003	MANTENIMIENTO OBRAS VIALES	1.732.078,00	28.250,00	1.760.328,00	1.488.435,43	84,55

ACTIVIDAD REALIZADA	RESULTADO
•MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS.	52,65 KM
•MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNALES	150,05 KM.
•TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LAS COMUNIDADES POR TEMA DE LLUVIA	7 COMUNIDADES
•APERTURA DE CALLES EN LA ZONA URBANA	5 BARRIOS
•TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL ÁREA URBANA	2 BARRIO
•DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ESTOS REQUERIMIENTOS SE LOS REALIZA EN ÉPOCAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO. ADEMÁS DE TRABAJOS DE EMERGENCIA POR INCENDIOS.	12 BARRIOS 6 COMUNIDADES




## TRAFICO Y TRANSPORTE

### ACTIVIDAD REALIZADA

**MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS.**

**REPROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DE TARIJA. (AV. ORURO, AV. LUIS DE FUENTES Y BARRIENTOS ORTUÑO)**

**INSTALACIÓN NUEVO PUNTO DE SEMÁFORO CALLE CAÑEROS Y AVENIDA LUIS DE FUENTES.**

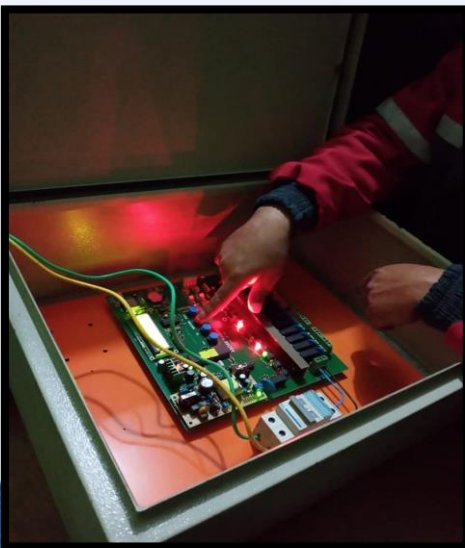

**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**

UBICACIÓN	SUPERFICIE
ROMPE MUELLE	200.25 M <sup>2</sup>
PASO DE CEBRA	334.60 M <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>534.85 M<sup>2</sup></b>



**DEMOILICION Y CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES**



**MANTENIMIENTO Y RE BACHEO DE LAS DIFERENTES VÍAS PUBLICAS.**

UBICACIÓN	VOLUMEN
VOLUMEN DE BACHEO TOTAL	63.20 m <sup>3</sup>



UBICACIÓN	CANT.
AV. PEDRO DOMINGO MURILLO	2
AV. LUIS DE FUENTES	2
CALLE CAÑEROS CASI BENI	1



**LIMPIEZA DE LA TERMINAL Y REMARCACIÓN DE ANDENES**



**REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE CIUDAD DE BERMEJO EN 4 PUNTOS (150 M2) POR UN MONTO DE 69.585,37. BS.**

**PROYECTO CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES EN 5 PUNTOS CON UN MONTO DE 17.825,71 BS.**



**MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLE GERMAN BUSCH, BARRIO 15 DE ABRIL CON UN AREA DE (1320 M2) CON UN MONTO DE 90.000,00**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 0 008	MANTENIMIENTO Y MEJ. UNIDADES EDUCATIVAS MCPIO. BJO.	700.000,00	0,00	700.000,00	646.813,51	92,40

UNIDAD EDUCATIVA	ACTIVIDAD EJECUTADAS POR EL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
25 DE MAYO	Mantenimiento. batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, pintado salón, pasillo principal, colocado e instalado tinaco mas lavamanos
KINDER TARIJA	Mantenimiento. batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, retiro y reposición piso cerámico, inst. tanque elevado bomba de agua, reparación portón metálico, colocado e inst. tinaco mas lavamanos
MARISCAL SANTA CRUZ	Limpieza desagüe, canaletas, podado de árboles, mant. sistema eléctrico, batería de baños, mobiliario, reposición de cubierta y piso cerámico
DIURNO BOLIVIA	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, colocado e inst. tinaco mas lavamanos
8 DE SEPTIEMBRE	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, pintado dirección, aulas, sellado filtraciones cubierta.
GUIDO VILLAGOMEZ	Mant. batería de baños, sist. eléctrico, mobiliario, colocado e instalado tinaco mas lavamanos, reubicación bomba de agua, elaboración colocado puerta metálica baños nivel inicial.
AULIO ARAOZ	Mant. batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, confección puerta mosqueras y bastidor ventanas, colocado e inst. tinaco mas lavamanos.
ANTONIO JOSE DE SUCRE	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, bomba de agua, elaboración rejas metálicas, colocado e instalado tinaco mas lavamanos, limpieza y sellado cámara de inspección





UNIDAD EDUCATIVA	ACTIVIDAD EJECUTADAS POR EL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
OCTAVIO CAMPERO E.	Limpieza tinacos, mant. batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, bombas de agua.
SAN ANTONIO	Mantenimiento batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, colocado e instalado tinaco mas lavamanos
C E A	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario
LA ESPERANZA	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, canaletas y bajantes, colocado e inst. tinaco mas lavamanos
COLONIA LINARES	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, tanque y bomba de aguas, instalación acometida sanitaria red nueva
25 DE ENERO	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, refacción portón y rejas metálicas, pintado aulas, colocado malla puertas y ventanas
ARROZALES	Mant. batería de baños, mobiliario, sistema eléctrico, remoción cerámico, colocado e inst. tinaco mas lavamanos.
EL NUEVE	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, renovación bomba de agua.
NARANJITOS	Mant. cubierta, batería de baños, sistema sanitario, mobiliario, ampliación cubierta galería, colocado malla puertas.
BARREDERO	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, malla puertas y ventanas
PORCELANA	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, mobiliario, colocado malla ventanas
LOS POZOS	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, sellado cubierta
EL TORO	Mant. batería de baños, sistema eléctrico, retiro canaletas y bajantes, reposición malla puertas mosqueras.

### CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA SOBR TECHO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLONIA LINARES CON UN MONTO DE 99.948,48 BS.



### CUBIERTAS SOBRE LOZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 25 DE MAYO POR UN MONTO DE 99.959,34 BS.



### COMPLEMENTACION Y REFACCION SOBRE LOZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE POR UN MONTO DE 58.213,77 BS.



### RENOVACION PISO PATIO UNIDAD EDUCATIVA KINDER TARIJA POR UN MONTO DE 99.907,44 BS. (516,03 m2 colocación de cerámico)





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
22 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPIO BJO.	108.261,00	100.575,50	208.836,50	64.068,45	30,68

## **GASTOS – MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 3 CANCHAS DE RAQUETA FRONTON, CANCHA DE FUTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO – BARRIO SAN SANTIAGO.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE MOTOCICLISMO.

**REFACCION RAQUETA FRONTO  
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO POR UN  
MONTO DE 56.319,36 BS.**

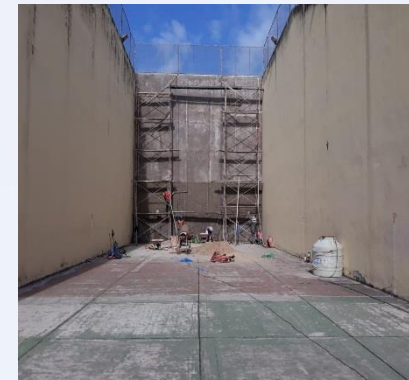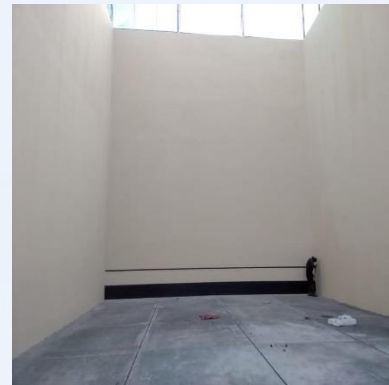

### MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS

- Se realizo el mantenimiento y mejoramiento de las 3 canchas de raqueta frontón, cancha de futbol 11, desmalezado, arreglo de los baños, del Complejo Deportivo – barrio San Santiago.



- Se realizó el mantenimiento y mejoramiento con el personal del G.A.M.B., la cancha de fútbol 11 de pasto sintético, las mallas detrás de los arcos, los baños del Estadio Municipal.



- Se realizó el mantenimiento y mejoramiento con el personal del G.A.M.B., el desmalezado y la limpieza de la cancha San Antonio.





- Se realizó el nivelado y mejoramiento con el personal y maquinaria del G.A.M.B., la cancha de fútbol 11 de yacimientos, la cancha de fútbol 7 del Jardín Botánico.



- Se realizó el mantenimiento, mejoramiento y desmalezado, con el personal y maquinaria del G.A.M.B., el circuito de motociclismo, campo deportivo utilizado para los entrenamientos y campeonatos de los deportistas de la Asociación municipal de Motociclismo.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
024 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CENTROS TURISTICOS	97.000,00	10.000,00	107.000,00	41.467,95	38,76

- ❖ Se realizó la contratación de personal para realizar los mantenimientos y resguardo de centros turismos.
- ❖ Se realizó la compra de material de escritorio para realizar todos los trámites administrativos de la Unidad y elaboración de proyectos.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
19 0 001	FORTALECIMIENTO DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO	592.187,00	-3.640,00	588.547,00	358.744,85	60,95

Recepción, inspección, revisión y aprobación de tramites de Lote, Lote y levantamiento de Vivienda, dentro del proceso de Regularización de construcciones y predios consolidados dentro de las normas municipales.



DETALLE	N° TRAMITES
Tramites ingresados	410
Transferencia de bienes	82
Aprobación de levantamiento construcción	192
Aprobación Proyecto construcción	12
Informes Catastrales	58
Certificados Catastrales	96
Certificado de no área verde	18
Procesos judiciales Usucapión	66

CARPETAS INGRESADAS Y APROBADAS GESTION 2022		
CARPETAS INGRE. 2022	CARPETAS APROB. 2022	CARPETAS APROB. GESTION PASADAS
171	192	68

EN CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY 247 SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS PEDIALES PARA SU REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO.

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN GMSS MOVIL RTK UHF PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE VERIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE PLANO DE LOTES, LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIONES, INSPECCIONES, VERIFICACIONES, NOTIFICACIONES PARA CONSTRUCCIÓN, ETC.



# PROYECTOS CONCLUIDOS



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
10 16030001100000 000	EQUIP. PARA APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y CAMINOS DE BERMEJO	139.236,00	614.728,61	753.964,61	753.964,61	100,00

PROVEEDORES	CANT	UNIDAD	COSTO TOTAL ADJUDICACION	CONTRAPARTE CREDITO FNDR/16	CONTRAPARTE GAMB
NIBOL LTDA	10	EQUIPOS	15.453.072,00	11.301.701,91	4.151.370,09
CROWN LTDA	1	EQUIPOS	313.896,00	229.569,82	84.326,18
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>		<b>15.766.968,00</b>	<b>11.531.271,74</b>	<b>4.235.696,26</b>
<b>ESTRUCTURA FINANC.</b>			<b>100,00</b>	<b>73,14</b>	<b>26,86</b>

**ENTREGADO FISICAMENTE  
2016**

**SE CANCELÓ BS. 753.964,61  
CON EL CUAL SE PUDO CERRAR  
EL 100% FINANCIERAMENTE  
DEL PROYECTO EN 2022**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 02876683400000	CONST. SIST. AGUA POTABLE CAÑADON BUENA VISTA (BERMEJO)	0,00	9.539,00	9.539,00	9.538,68	100,00

**CONCLUIDO FISICAMENTE  
2018**

FISCAL DE OBRA F.P.S	Ing. Elías Aramayo
FISCAL DE OBRA G.A.M.B	Ing. Sergio Arturo Zubieta Bello
FINANCIAMIENTO	F.P.S. 70% - G.A.M.B. 30%
MONTO DE CONTRATO DE OBRA	Bs. 2.272.764,98
EMPRESA CONSTRUCTORA	SERVICIOS MELVIK
MONTO DE SUPERVISIÓN	Bs. 140.918,47
SUPERVISIÓN TÉCNICA	Ing. Linder Marcelo Morales Ruiz
MONTO DE DESCOM	Bs. 112.734,77
DESCOM	Lic. José Ariel Altamirano Martínez
INVERSION TOTAL	Bs. 2.526.418,22
AVANCE FÍSICO	100 %
FECHA DE INICIO	12 de Agosto del 2017
PLAZO DE EJECUCION	240 D.C.
FECHA DE CONCLUSIÓN	09 de Abril del 2018
ESTADO ACTUAL	CONCLUIDA

**DESCRIPCIÓN:** Agua potable para 46 familias beneficiarias, el sistema de agua su abastecimiento será por gravedad, con líneas de aducción, tanque de distribución, redes de distribución de agua y acometida domiciliarias.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 02876688900000	CONST. SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS POZOS (BERMEJO)	0,00	442.885,09	442.885,09	437.982,18	98,89

<b>LOCALIZACION</b>	Comunidad Los Pozos - MUNICIPIO DE BERMEJO
<b>FISCAL DE OBRA F.P.S</b>	Ing. Vanessa Flores Amador
<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	Ing. Sergio Zubieta B.
<b>FINANCIAMIENTO</b>	F.P.S. 68,28% - G.A.M.B. 31,72%
<b>MONTO DE CONTRATO DE OBRA</b>	Bs. 1.876.371,02
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	Constructora y Consultora Condori B.
<b>MONTO DE SUPERVISIÓN</b>	Bs. 128.827,59
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>	Ing. Santiago Reyes Gallardo
<b>AVANCE FÍSICO</b>	100%
<b>FECHA DE INICIO</b>	29 de Abril de 2021
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	340 Días Calendario
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	04 de Abril de 2022
<b>ESTADO ACTUAL</b>	CONCLUIDA

**DESCRIPCIÓN:** sistema de agua potable para la comunidad Los Pozos donde se contempla diferentes etapas constructivas: Red de Distribución, Tanque de Almacenamiento, Obra de Toma Tipo Azud, Línea de Aducción, Hipoclorador, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. **Beneficiarios:** 75 familias

**CONCLUIDO FISICAMENTE  
2022**





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 02876689000000 000	CONST. SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD PORCELANA (BERMEJO)	0,00	204.172,48	204.172,48	195.281,46	95,65

**LOCALIZACION**

Comunidad Porcelana - MUNICIPIO DE BERMEJO

**CODIGO FPS**

FPS - 06 - 00004503

**FISCAL DE OBRA F.P.S**

Ing. Vanessa Flores Amador

**FISCAL DE OBRA G.A.M.B**

Ing. Sergio Zubieta B.

**FINANCIAMIENTO**

F.P.S. 68,28% - G.A.M.B. 31,72%

**MONTO DE CONTRATO DE OBRA**

Bs. 1.411.386,31

**EMPRESA CONSTRUCTORA**

Asociación Accidental El Molino

**MONTO DE SUPERVISIÓN**

Bs. 103.000,00

**SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Ing. Armando Carlos Zenteno Maráz

**AVANCE FÍSICO**

100%

**FECHA DE INICIO**

29 de Abril de 2021

**PLAZO DE EJECUCION**

300 Días Calendario

**FECHA DE CONCLUSIÓN**

23 de Febrero de 2022

**ESTADO ACTUAL**

CONCLUIDA

**DESCRIPCIÓN:** Componentes: perforación de un pozo, sistemas de aducción (280,00 ml.), tanque de almacenamiento (40 m<sup>3</sup>), hipoclorador, cierre perimetral, sistemas de distribución (compuesto de diferentes ramales con sus respectivos diámetros de tuberías de PVC, haciendo una longitud total de 8.972,27 ml.

**BENEFICIARIOS:** 104 Familias.

**CONCLUIDO  
FÍSICAMENTE 2022**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 16030012200000 000	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE INTERN- LAGUNA OXIDACION FASE II	115.090,00	166.873,48	281.963,48	274.804,78	97

<b>FINANCIAMIENTO</b>	100% MUNICIPIO G.A.M.B.
<b>EMPRESA CONSTR.</b>	ASOC. ACC. LA COMPAÑÍA
<b>MONTO DE OBRA</b>	BS. 979,710,33.-
<b>FISCAL DE OBRA</b>	ING. SERGIO ZUBIETA
<b>INVERSION TOTAL</b>	BS. 1.028.546,23
<b>AVANCE FÍSICO</b>	100,00 %
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 DE FEBRERO DE 2020
<b>PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL</b>	154 D.C.
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRACTUAL</b>	12 DE JULIO DE 2020
<b>AMPLIACION DE PLAZO SEGÚN O.C. N°1 + O.C. N°2</b>	117 DIAS CALENDARIO
<b>COMPENSACION DE PLAZO SEGÚN O.C. N°1</b>	164 DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ORIGINAL + O.C.N°1 + O.C. N°2 + O.C. N°3</b>	296 DIAS CALENDARIO
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL + O.C. N°3</b>	1.028.546,23 BS.
<b>FECHA CONCLUSION SEGÚN O.C. N°3</b>	06 DE JUNIO DE 2022
<b>ESTADO ACTUAL</b>	CONCLUIDA
<b>DESCRIPCIÓN:</b> CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE DIÁMETRO 10 Y 6 PULGADAS DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTRAS OBRAS DE PROTECCIÓN, LONGITUD DE RED DE 2.500 ML	
<b>BENEFICIARIOS:</b> 127 BENEFICIARIOS.	

**CONCLUIDO 2022**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 16030012300000 000	CONST. INTERCONEXION ALCANTARILLADO SANITARIO B. LAS PALMERAS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.676,06	89,19

**CONCLUIDO**

• REALIZAR LA INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA COLECTOR SANITARIO DE INTERCONEXIÓN DESDE EL BARRIO LAS PALMERAS HASTA LA AV. BOLÍVAR.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 08620262200000 000	CONST. PAVIMENTO CALLES Y AVENIDAS CIUDAD DE BERMEJO GAM BERMEJO	0,00	222.924,07	222.924,07	222.924,07	100,00

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	Bs.10.047.557,98
	FNDR 77,03%	Bs. 7.739.228,20
	GAMB 22,97%	Bs. 2.308.329,78
EMPRESA CONSTRUCTORA:	OBRASUR S.R.L. Mario Valeriano G.	
CONTRATO DE OBRA	Bs. 9.660.414,74	
SUPERVISOR DE OBRA:	EOLO SRL Jorge Alain Padilla	
CONTRATO SUPERVISION:	Bs. 387.143,24	
TOTAL INVERSION	Bs. 10.047.557,98	
AVANCE FISICO	100%	
FECHA DE INICIO:	10/12/2019	
PLAZO DE EJECUCION:	365 DIAS	
FECHA CONCLUSION:	09/12/20	
ESTADO PROYECTO:	CONCLUIDO	
DESCRIPCION: construcción de pavimento rígido para circulación vehicular de aproximadamente 18 cuadras.		

DESCRIPCIÓN DE CUADRAS	BARRIO BENEFICIADOS	Nº Cuadras p/Barrio
ARGENTINA / TARIJA Y BARRANQUERAS	CENTRAL	1
AMELLER / P. DOMINGO MURILLO Y JOSE YACHE	15 DE ABRIL	4
AMELLER / JOSE YACHE Y CHUQUISACA		
AMELLER / CHUQUISACA Y BARRIENTOS		
GERMAN BUCH / P. DOMINGO MURILLO Y JOSE YACHE		
AMELLER / BARRIENTOS Y LA PAZ	LINDO	3
AMELLER / LA PAZ Y ARGENTINA		
AMELLER / ARGENTINA Y BENI		
MOTO MENDEZ POTOSI - URUO	MIRAFLORES	1
M. SANTA CRUZ / BARRIENTOS Y LA PAZ/ARGENTINA	AEROPUERTO	3
M. SANTA CRUZ / LA PAZ Y BENI	27 DE MAYO	6
PASAJE BOQUERON/ HILARIÓN TRUJILLO Y BARTOLINAS S.		
PASAJE BOQUERON/ HILARIÓN TRUJILLO		
PASAJE BOQUERON/ SN 2 Y SN 3	JUAN PABLO II Y VICTOR PAZ	6
INGRESO 3/ SN 2 Y SN 3		
INGRESO 3/ SN 3 Y SN 4	PETROLERO	18
INGRESO 3/ SN 4 Y COLORADOS		
TOTAL CUADRAS		18



**CONCLUIDO 2020**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 16030006700000 000	CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO COMUNIDAD PORCELANA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00

**CONCLUIDO 2020**

<b>FINANCIAMIENTO</b>	100% MUNICIPIO
<b>BENEFICIARIOS</b>	COMUNIDADES CAMPO GRANDE, PORCELANA Y TALITA
<b>EMPRESA CONSTR.</b>	CONSTRUCCIONES "JAVIER ROCHA"
<b>MONTO DE OBRA</b>	BS. 1.195.512,40
<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	BENJAMÍN CHACÓN
<b>INVERSION TOTAL</b>	BS. 1.195.512,40.-
<b>AVANCE FÍSICO</b>	100 %
<b>FECHA DE INICIO</b>	17 DE FEBRERO DEL 2020
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	110 D.C.
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	05 DE JULIO DEL 2020
<b>ESTADO ACTUAL</b>	CONCLUIDO

**DESCRIPCION:** CIERRE PERIMETRAL CON MALLA OLÍMPICA GALVANIZADA CON UN PERÍMETRO DE 532 MTS. CON UNA ALTURA DE 2.20MTS., CON DOS PORTONES. **BENEFICIARIOS:** VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PORCELANA Y LA TALITA.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
20 16030010500000 000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO 4	75.000,00	559.707,07	634.707,07	630.957,07	99,41

<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	ING. MARCELINO COLQUE
<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 80% - GAMB 20%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	OBRASUR SRL ING. MARIO VALERIANO GARECA.
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	9.422.128,16
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	A. ACC. ELIB, ING. MARCO CARDOZO
<b>MONTO CONTRATO:</b>	424.993,41
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	9.847.121,57
<b>AVANCE FISICO</b>	100%
<b>FECHA DE INICIO:</b>	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	466 DIAS
<b>BENEFICIARIOS</b>	CIUDAD DE BERMEJO

**DESCRIPCIÓN:** INFRAESTRUCTURA DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONSULTORIO MÉDICO GENERAL, LABORATORIO, FARMACIA, MATERNIDAD SALA DE EMERGENCIA, BATERÍA DE BAÑOS, ÁREA DE SERVICIOS, AMBIENTES PARA MÉDICOS RESIDENTES, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y DOTACIÓN DE AGUA, ACERA DE CIRCULACIÓN.

**CONCLUIDO 2017**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
20 16030020500000 000	CONST. CENTRO DE SALUD 21 DE DICIEMBRE DISTRITO 1	1.250.000,00	-871.022,87	378.977,13	0,00	0,00

<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	ING. NEIDA ORDOÑEZ
<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 25% - LEY 206 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	SIERRA VERDE, NELSON ZERON.
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	3.026.077,03
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	ASOC. ACC. BERMEJO
<b>MONTO CONTRATO:</b>	143.608,28
<b>TOTAL INVERSION</b>	3.169.685,31
<b>AVANCE FISICO</b>	100 %
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12/SEP/2019
<b>PLAZO DE EJECUCION+ ORDEN DE CAMBIO N°1 POR AMPLIACION DE PLAZO:</b>	609 DIAS CALENDARIOS
<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	13/MAYO/2021
<b>BENEFICIARIOS</b>	DISTRITO 1 (5 BARRIOS)
<b>DESCRIPCION:</b> CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, CUENTA CON UNA SALA DE ESPERA, 5 CONSULTORIOS, ENFERMERÍA, LABORATORIOS – DOT, SU SUPERFICIE APROXIMADA ES DE 610 M2.	
<b>BENEFICIARIOS:</b> 3.406 HABITANTES DEL DISTRITO 1 DE LOS CUALES 1.979 SON HOMBRES Y 1.427 SON MUJERES.	

**CONCLUIDO 2021**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 F030022900000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE BERMEJO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

**CONCLUIDO**

**PARA CANCELACION DE  
CONTRAPARTE GAMB -  
EQUIPAMIENTO**



**Beneficiarios:** 879 alumnos de la población estudiantil.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 F038976500000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA AULIO ARAOZ FASE II	100.000,00	840.346,67	940.346,67	562.141,10	59,78

<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>BARRIO MUNICIPAL</b>
<b>ENTIDAD FINANCIADORA</b>	G.A.D.T. : 90%.-G.A.M.B. : 10%
<b>FISCAL DE OBRA</b>	ING. SERGIO ARTURO ZUBIETA BELLO
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>	ING. RONALD FERNÁNDEZ A.
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	ASOC. ACCID. IBERICA Y ASOCIADOS
<b>MONTO OBRA</b>	BS. 12.920.390,09
<b>EMPRESA SUPERVISORA</b>	SERV. DE INGENIERÍA FERNANDEZ
<b>MONTO SUPERVISIÓN</b>	BS. 581.470,08
<b>TOTAL S/CONTRATO</b>	BS. 13.501.860,17
<b>COSTO EQUIPAMIENTO</b>	BS. 1.415.504,05
<b>COSTO TOTAL</b>	BS. 14.917.364,22
<b>FECHA ORDEN DE PROCEDER</b>	06 DE FEBRERO DE 2014.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	855 DÍAS CALENDARIO.
<b>MONTO DE EJECUCION CERRADO</b>	6.057.990,34 BS.
<b>IMPLEMENTACION ACT. NUEVOS TRABAJOS (NUEVO CONTRATO)</b>	1.623.965,29 BS.
<b>NUEVO MONTO A EJECUTAR TOTAL (CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES)</b>	8.321.970,45 BS.
<b>FECHA DE CONCLUSION S/O.C. N°4</b>	27 DE MAYO DE 2022
<b>EJECUCIÓN TOTAL FISICA:</b>	100,00%
<b>ESTADO ACTUAL</b>	CONCLUIDO
<b>DESCRIPCION:</b> ELABORACIÓN DE AULAS DE ENSEÑANZA, BLOQUES DE AULAS TANTO DE PRIMARIA COMO DE SECUNDARIA, SALA DE REUNIONES, BLOQUE DE BAÑOS, VIVIENDA DEL PORTERO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIERRE PERIMETRAL, ETC.	
<b>BENEFICIARIOS:</b> 666 ALUMNOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	

**CONCLUIDO 2022**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
22 F038976700000 000	CONST. STADIUM BARRIO MUNICIPAL	100.000,00	33.199.00	133.199,00	0,00	0,00

**CONCLUIDO 2017**



<b>LOCALIZACION</b>	BARRIO MUNICIPAL
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	ASOCIACION ACCIDENTAL TAJIBO
<b>MONTO CONTRATO DE OBRA:</b>	Bs. 26.756.675,5
<b>SUPERVISION:</b>	ASO.ACC. BJO. (a partir del 30/04/2015)
<b>MONTO DE SUPERVISION:</b>	Bs. 999.999,00
<b>MONTO TOTAL DE INVERSION:</b>	Bs. 27.756.674,48
<b>ORDEN DE PROCEDER:</b>	15 de Septiembre de 2014
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	540 D.C.
<b>FECHA DE PARALIZACION:</b>	16 de Enero de 2015
<b>FECHA DE CONCLUSION</b>	18 de Octubre de 2017
<b>AVANCE FISICO</b>	100%
<b>BENEFICIARIOS</b>	Ciudad de Bermejo

**DESCRIPCION:**

- Gradería para 6000 espectadores.
- Área aproximada de Construcción 12.900,82 m2.
- Cuenta con área para fotógrafos y tribuna para discapacitados.
- Baños en ambas graderías: Norte y Sur.
- Sala de prensa y ambientes de administración.
- Modulo policial.
- Ambiente para primeros auxilios y ambiente de radiografías Anti Doping

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 16030022300000 000	CONST. TECNICO HUMANISTICO U.E. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BERMEJO	34.153,00	677.111,77	711.264,77	419.054,91	58,92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	5.811.347,37
	UPRE	5.065.646,58
	GAMB	745.700,79
FISCAL DE OBRA:	ARQ. JULIETA SALAZAR G.	
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ASOC. ACC. DEL SUR, ARQ. JAIME SÁNCHEZ	
CONTRATO DE OBRA:	BS. 5.065.646,58	
MONTO DE OBRA SEGÚN C.M. N°2:	BS. 5.583.387,89	
SUPERVISOR DE OBRA:	TERRASUR, ING. MARCO CARDOZO B.	
CONTRATO SUPERVISION:	BS. 227.959,48	
TOTAL INVERSION:	BS. 5.546.117,71	
AVANCE FISICO :	100,00 %	
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2019	
PLAZO DE EJECUCION:	300 DIAS CALENDARIO	
FECHA CONCLUSION SEGÚN CONTRATO:	28 DE ABRIL DE 2020	
INCREMENTO DE MONTO SEGÚN OC N°3 (4,98%):	252.511,65 BS.	
INCREMENTO DE MONTO SEGÚN CM N°2 (5,21%):	265.229,66 BS.	
MONTO CONTRACTUAL + CM N°2	5.583.387,89 BS.	
PLAZO MODIFICADO S/ CM N°2:	409 DIAS CALENDARIO	
FECHA CONCLUSION SEGÚN O.C. N°5:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
ESTADO PROYECTO:	CONCLUIDO - CON RECEPCION PROVISIONAL	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> : 6 AULAS, BATERÍA DE BAÑOS, ÁREA ADM. EL SEGUNDO BLOQUE ES DE DOS NIVELES CUENTA CON 2 LABORATORIOS, 2 TALLERES. EL TERCER BLOQUE ES DE TRES NIVELES CONFORMADO POR 9 AULAS. LOS TRES BLOQUES SE CONECTAN ENTRE SÍ A TRAVÉS DE PASILLOS DE CIRCULACIÓN, GRADAS Y RAMPLA, CANCHA POLIFUNCCIONAL. <b>BENEFICIARIOS:</b> 575 ALUMNOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.		
SALDO FINANCIERO PARA CERRAR EL PROYECTO Bs.: 292.046,46 (273.558,36 obra - 18.488,10 supervisión)		


**CONCLUIDO 2022**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
16 08620267200000	MEJ. Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO BERMEJO FASE I GAM BJO	0,00	7.557.893,44	7.557.893,44	7.484.299,75	99,03

<b>FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>Bs. 7.447.228,72</b>
	<b>FNDR 77,007%</b>	<b>Bs. 5.734.887,42</b>
	<b>GAMB 22,993 %</b>	<b>Bs. 1.712.341,30</b>
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	<b>EMPRESA ROYAL ARROW LIGHTING BOLIVIA S.R.L.</b>	
<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Bs. 7.447.228,72	
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	<b>CONSTRUCTORA &amp; CONSULTORA CAVASE</b>	
<b>CONTRATO SUPERVISION:</b>	Bs. 50.000,00	
<b>TOTAL INVERSION</b>	Bs. 7.497.228,72	
<b>AVANCE FISICO</b>	100%	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	23/06/2022	
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	180 DIAS	
<b>FECHA CONCLUSION:</b>	20/12/22	
<b>ESTADO PROYECTO:</b>	Ejecución	

**CONCLUIDO 2022**

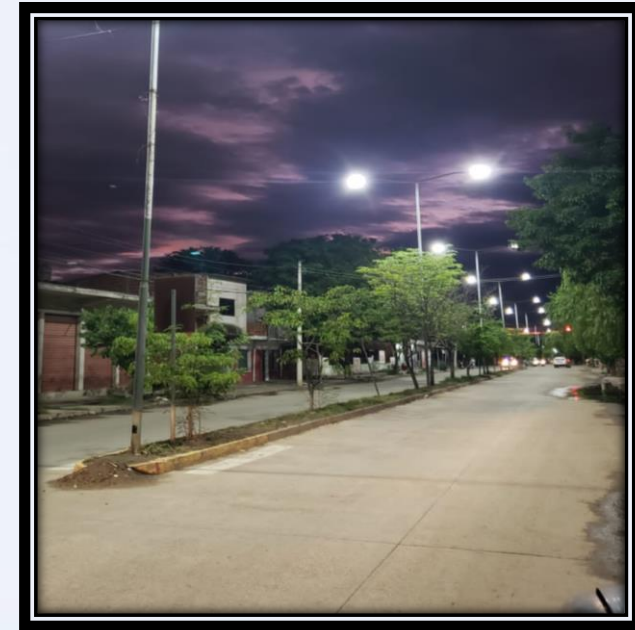

**DESCRIPCION:** EL PROYECTO TIENE UNA COBERTURA DENTRO DEL ÁREA URBANA CON UN TOTAL DE 2.159 LUMINARIAS.

# PROYECTOS EN EJECUCION



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 F038962700000 000	CONST. UNID EDUCATIVA BARREDERO	2.288.321,00	0,00	2.288.321,00	1,510,860,65	66,02

<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	Ing. Franz Delgado Escaray
<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 25% - LEY 206 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	Empresa Constructora "EL ALGARROBO"
<b>MONTO CONTRATO OBRA:</b>	9.550.292,29
<b>SUPERVISION:</b>	ASOCIACION ACCIDENTAL LOS CHAPACOS Y ASOCIADOS
<b>MONTO CONTRATO:</b>	401.131,75
<b>TOTAL INVERSION</b>	9.951.424,04
<b>AVANCE FISICO</b>	34,70%
<b>ORDEN DE PROCEDER:</b>	9 de Septiembre 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	630 Días + 967 días Ampliación Plazo
<b>FECHA DE CONCLUSION</b>	25 de octubre de 2023
<b>BENEFICIARIOS</b>	131 estudiante de primaria 26 estudiantes de secundaria De la comunidad de Barredero
<b>ESTADO ACTUAL</b>	En Ejecución

**DESCRIPCION:** Se ejecuto los trabajos obra gruesa de planta baja y planta alta, hasta el ítem de vigas de H<sup>º</sup>A<sup>º</sup>. En el modulo de AULAS se ejecuto los trabajos de planta baja y planta alta, hasta el ítem de viga de H<sup>º</sup>A<sup>º</sup>. Llegando a un porcentaje de avance físico de 34,70%.

## EJECUCION



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
21 F038976400000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA 8 DE SEPTIEMBRE	150.000,00	3.491.570,66	3.641.570,66	3.624.202,82	99,52

<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	Ing. Sergio Arturo Zubieta Bello
<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 80% - G.A.M.B. 20%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	ASOC. ACC. PORCELANA, Filiberto Romero
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	16.903.536,36
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>	TERRASUR, Marcos Cardozo
<b>MONTO DE SUPERVISIÓN</b>	769.912,39
<b>TOTAL INVERSION</b>	17.673.448,75
<b>AVANCE FÍSICO</b>	62,00 %
<b>Fecha de Inicio:</b>	08 de Agosto de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	908 Días Calendario
<b>INCREMENTO SEGÚN O.C. Nº2:</b>	833.874,57 Bs.
<b>CONTRATO ORIGINAL+O.C. Nº2:</b>	17.737.410,93 Bs.
<b>CONTRATO ORIGINAL+C.M. Nº2:</b>	17.737.410,93 Bs.
<b>ESTADO ACTUAL</b>	<b>EN EJECUCION</b>
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Construcción de un modulo nivel inicial (Concluido), y otro modulo primario y secundario de 3 niveles, ambos módulos cuentan con aulas, batería de baño, áreas de circulación. <b>BENEFICIARIOS:</b> La población beneficiaria en forma directa, son los 624 alumnos de la población estudiantil.	

### EJECUCION



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
011 028766970000 00 000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE COLONIA JOSE MA. LINARES (BERMEJO)	0,00	1.061.538,00	1.061.538,00	554.225,42	52,21

PROYECTO	: "MEJ. SIST. AGUA POTABLE COLONIA JOSÉ MARIA LINARES (BERMEJO)"
FINANCIAMIENTO	: FPS (Fondo De Inversión Nacional Productiva y Social). 100.00%
EJECUTOR	<b>FPS (Fondo De Inversión Nacional Productiva y Social). 100.00%</b>
CONTRATISTA	"SOLIDEC"
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ramón Martínez P.
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Eduardo David Rojas Posadas
FISCAL DE OBRA	Ing. Alvaro Valdez M.
DESCOM-FI	Ing. Franz Delgado E.
AVANCE FISICO	22,21%
AVANCE FINANCIERO	42,21%
MONTO DE CONTRATO	1.575.147,50 Bs.
FECHA DE INICIO	19 Octubre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	210 D.C.
FECHA DE CONCLUSIÓN S.	17 de Mayo de 2023
SALDO POR EJECUTAR	1.020.922,08 Bs (57,79%)





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 16030022700000	CONST. MODULO TECNOLOGICO TECNICO HUMANISTICO BERMEJO - TARIJA	0,00	2.231.892,02	2.231.892,02	0,00	0,00



DESCRIPCIÓN	MONTO UPRE	PART. UPRE
INFRAESTRUCTURA	11.103.940,38	100%
SUPERVISIÓN	388.637,91	
FISCALIZACIÓN	166.559,10	
AUDITORIA	166.559,10	
<b>TOTAL</b>	<b>11.825.696,49</b>	<b>600 DÍAS</b>



# PROYECTOS PARALIZADOS



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 16030022400000 000	CONST. MERCADO MUNICIPAL ABASTO BERMEJO	150.000,00	10.461.712,91	10.611.712,91	8.110.781,60	76,43

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	18.203.849,24
	UPRE 95,69%	17.419.951,43
	GAMB 4,31%	783.897,81

<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	SIERRA VERDE, Nelson Zerón
<b>CONTRATO DE OBRA</b>	Bs. 17.419.951,43
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ARQUITECTURA I&A
<b>CONTRATO SUPERVISION:</b>	Bs. 783.897,81
<b>TOTAL INVERSION</b>	Bs. 18.203.849,24
<b>AVANCE FÍSICO</b>	95,00%
<b>FECHA DE INICIO:</b>	04/07/2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	400 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA CONCLUSION:</b>	06/08/2020
<b>AMPLIACION DE PLAZO O.C. N°1 + N°2:</b>	602 DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ORIGINAL + O.C. N°1 + O.C.N°2:</b>	1002 DÍAS CALENDARIO
<b>ESTADO PROYECTO:</b>	PARALIZADO

**DESCRIPCION:** Comprende la construcción de un mercado con diferentes rubros de venta para apoyo al sector productivo campesino y de comercio varios.

**BENEFICIARIOS:** 216 Locatarios y toda la zona de la Urbanización El Porvenir.

### PARALIZADO



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 F030009300000 000	CONST. SIST. ALCANT. PLUVIAL CIUDAD DE BERMEJO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PARALIZADO**

## **PARALIZADO POR PROBLEMAS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA**

Actividades del proyecto se encuentran suspendidas desde 2012 por problemas de tipo social, administrativo y legal.

Como es de conocimiento general, primeramente se tuvieron problemas de orden político social, luego administrativo legal hasta que se definió el cierre del contrato con la constructora.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 F038975700000 000	MEJ. PRODUC. Y CONSUMO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE BERMEJO	75.000,00	21.014,00	96.014,00	0,00	0,00

**PARALIZADO**

**PROYECTO EN ESPERA DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO**

**Beneficiarios:** La población beneficiaria en forma directa, son a 6.239 familias en el Municipio de Bermejo.

**FINANCIERAMENTE  
PARALIZADO POR FALTA  
TRANSFERENCIA DEL GADT**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 16030008600000 000	CONST. ASFALTO CALLES BO LAS PALMERAS	50.000,00	-10.579,00	39.421,00	0,00	0,00

<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 25% - LEY 206 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	OBRASUR SRL Ing. Mario Valeriano Gareca.
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	9.327.557,46
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	APOLO Ing. Jorge Alain Padilla Ríos
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	373.781,65
<b>TOTAL INVERSION</b>	9.701.339,11
<b>AVANCE FISICO</b>	74,64%
<b>FECHA DE INICIO:</b>	13 septiembre 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	540 DIAS
<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	05 de marzo 2021
<b>BENEFICIARIOS:</b>	B° LAS PALMERAS
<b>ESTADO PROYECTO:</b>	Paralizado

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto comprende la construcción de pavimento rígido para circulación vehicular de aproximadamente 18 cuadras.

**PARALIZADO**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
17 16030021900000 000	CONST. PASEO PEATONAL RIO BERMEJO	50.000,00	-50.00,00	00,00	0,00	0,00

<b>FISCAL DE OBRA G.A.M.B</b>	Ing. Marcelino Colque
<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D. 25% - <b>LEY 206</b> 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	OBRASUR SRL Ing. Mario Valeriano Gareca.
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	11.176.378,80
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	TERRASUR, Marco Cardozo
<b>MONTO CONTRATO:</b>	539.711,80
<b>TOTAL INVERSION</b>	11.716.090,60
<b>AVANCE FISICO</b>	32%
<b>FECHA DE INICIO:</b>	29 noviembre de 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	540 DIAS
<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	22 de Mayo de 2021
<b>BENEFICIARIOS</b>	Ciudad de Bermejo
<b>ESTADO PROYECTO</b>	Paralizado por Impago de Planillas.

**PARALIZADO**



**DESCRIPCIÓN:** Paseo peatonal sobre la orilla del rio Bermejo en el lado boliviano, una rotonda, espacios de recreación e iluminación pública.

**BENEFICIARIOS:** Vecinos de la ciudad de Bermejo.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
20 F038964600000 000	CONST. CERETROP - BJO	39.811,00	-39.811,00	0,00	0,00	0,00

<b>LOCALIZACION:</b>	<b>B° Aeropuerto Av. Bolívar entre Calle Beni y Argentina</b>
<b>EMPRESA CONSULTORA:</b>	ASOC. ACC. LA COMPAÑÍA
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	Bs. 119.750,00
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 de marzo 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	130 Días Calendario
<b>FECHA DE CONCLUSIÓN SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO N°1:</b>	08 de Marzo de 2020
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DEL ESTUDIO (%.)</b>	85 %
<b>ESTADO ACTUAL:</b>	EN ESPERA DE EMISION EN SEDES TARIJA DEL CERTIFICADO DE PERTINENCIA.

**DESCRIPCIÓN:** Diseño final para la implementación de un laboratorio de referencia de enfermedades tropicales de alta complejidad para el Municipio de Bermejo que beneficiara a todo el departamento de Tarija.

**BENEFICIARIOS:** Considerando la demanda de análisis de laboratorios especiales en relación a enfermedades endémicas y otras, será de 4.026 pruebas de laboratorio.

Monto Saldo a Ejecutar Bs: 17.962,50

**PARALIZADO**





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
20 16030022000000 000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO 2 BERMEJO	1.850.000,00	-948.086,50	901.913,50	0,00	0,00

<b>FINANCIAMIENTO:</b>	G.A.D.T. 25% - LEY 206 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	ASOC. ACC. ADESSUR
<b>MONTO CONTRATO OBRA</b>	3.706.179,46
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	TERRASUR Ing. Marco Cardozo
<b>MONTO CONTRATO:</b>	170.362,19
<b>TOTAL INVERSION</b>	3.876.541,65
<b>AVANCE FISICO</b>	38,82%
<b>FECHA DE INICIO:</b>	24/SEPT/2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:</b>	365 DIAS CALENDARIO
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN O.C. N°1:</b>	163 DIAS
<b>FECHA CONCLUSION:</b>	04/MARZO/2021
<b>BENEFICIARIOS:</b>	Distrito 2 (4 Barrios)
<b>ESTADO PROYECTO:</b>	PARALIZADO

**PARALIZADO**



**DESCRIPCION:** Construcción centro de salud, cuenta con una sala de espera, 5 consultorios, enfermería, laboratorios - DOT's, superficie aproximada de construcción es de 600 m2.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
22 16030009500000 000	CONST. GRADERIAS CANCHA POLIFUNCIONAL Bº 1 DE MAYO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D.T. 25% - <b>LEY 206.</b> 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	ASOCIACION ACCIDENTAL UNISUR
<b>MONTO CONTRATO :</b>	2.412.495,29
<b>SUPERVISION:</b>	SELECON Ingeniería en Servicios
<b>MONTO SUPERVISION:</b>	132.556,45
<b>TOTAL INVERSION:</b>	2.545.051,74
<b>AVANCE FÍSICO</b>	26,34 %
<b>ORDEN DE PROCEDER:</b>	10 de Septiembre 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	267 días
<b>FECHA DE CONCLUSION</b>	02 de junio de 2020
<b>ESTADO ACTUAL</b>	Paralizada por impago de planillas
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Graderías y ambientes nuevos en la cancha polifuncionalidad del Barrio 1º de Mayo, mediante una construcción apropiada para facilitar el acceso a la actividad deportiva beneficiando de esta manera a los vecinos del barrio, barrios aledaños y población en general.
<b>BENEFICIARIOS:</b>	1.058 vecinos del Barrio 1º de Mayo.
MONTO SALDO A EJECUTAR Bs: 2.064.729,19 (obra 1.950.664,36 - supervisión 114.064,83)	

**PARALIZADO**



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
22 16030009700000 000	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO 15 DE ABRIL	50.000,00	199.718,00	249.718,00	249.718,00	100,00

<b>FINANCIAMIENTO</b>	G.A.D.T. 25% - LEY 206. 75%
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONDORI B
<b>MONTO CONTRATO ;</b>	1.781.931,76
<b>SUPERVISION:</b>	Ing. Alicia L. Vizcarra V.
<b>TOTAL INVERSION:</b>	1.781.931,76
<b>AVANCE FÍSICO</b>	64,79 %
<b>ORDEN DE PROCEDER:</b>	04/10/2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	273 días
<b>FECHA DE CONCLUSION</b>	02/07/2020
<b>ESTADO ACTUAL</b>	PARALIZADO

**PARALIZADO**



**DESCRIPCION:** Planta Baja

- Baños públicos para ambos sexos
- Camerinos y baños para cada equipo
- Cuarto de seguridad
- Snacks -área de mesas
- Cierre de campo deportivo

Planta Alta

- Salón 1
- Salón 2
- Dos ambientes (cuartos)

# PROYECTOS EN EVALUACION



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
11 16030022500000 000	EQUIP. ADQUISICIÓN EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA EMP.MUNIC. DE AGUA Y ALCANT MUNICIPIO DE BERMEJO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

El agua es un derecho humano de primer orden así lo establece la constitución política del estado, por lo que dotar y brindar un buen servicio de agua a la población de Bermejo, manteniendo las condiciones de buen funcionamiento del sistema de agua potable, y la captación de agua es de atención prioritaria para las autoridades, es así que, entre el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO y el GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA, suscribieron un Convenio Intergubernativo firmado N° 014/2021.

**EVALUACIÓN**



**LOCALIZACION:** BERMEJO

**COSTO DEL OBRA:** 200.00,00

**PLAZO DE EJECUCION:** 135 DIAS


**ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:** Actualmente se encuentra para realizar trámites administrativos para posterior inicio de proceso de contratación 125

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
12 F030030600000 000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD CAMPO GRANDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO CON EL MINISTERIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, YA SE CUENTA A LA FECHA CON LA NO OBJECION DE LA CANCELLERIA ARGENTINA**

<b>LOCALIZACION:</b>	Comunidad Campo Grande
<b>COSTO DEL OBRA:</b>	21.082.199,78
<b>COSTO SUPERV + DESCOM:</b>	2.341.513,20
<b>TOTAL COSTO:</b>	23.423.712,98
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	540 DIAS
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	EVALUACION CANCELLERIA PARA APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO (COBINABE)

**DESCRIPCION:** 1 obra lateral, Canal primario 2,27 km (2 x 1,5 mt) Canal Secundario 5,74 km (1,80 x 1,10mts.), canal de distribución . (1,4 x 0,70 mts), para regar 2,517 has. Para 534 productores

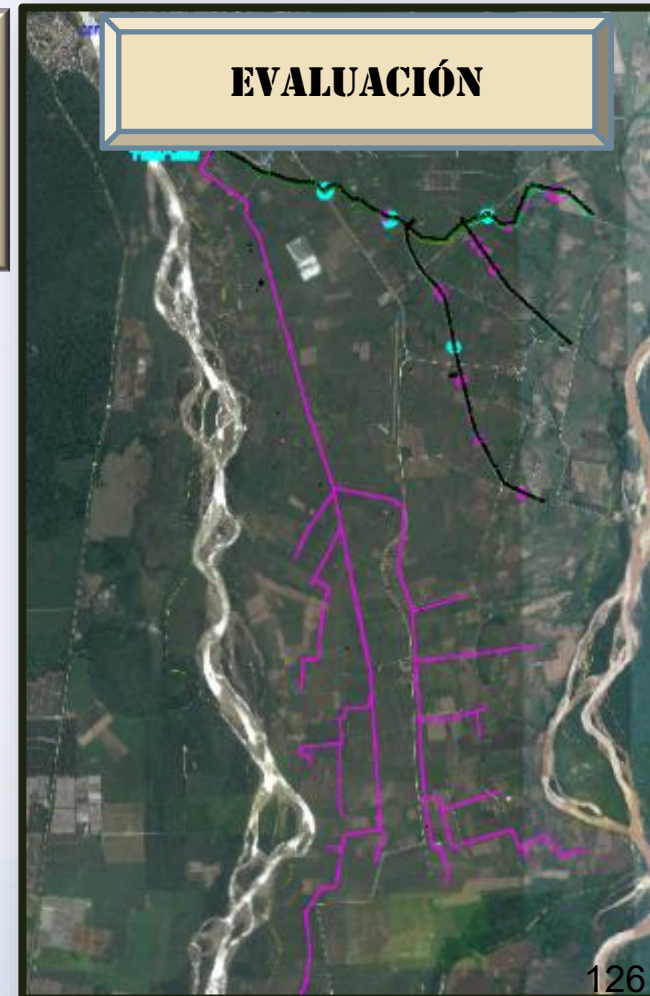

# PROYECTOS PARA INICIAR GESTIÓN 2023



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.
16030022800000	CONST. CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS VULNERABLES EN SITUACION DE VIOLENCIA - BERMEJO	9.397.342,26	400 días	UPRE



DESCRIPCIÓN	MONTO UPRE	PART. UPRE
INFRAESTRUCTURA	8.823.795,56	100%
SUPERVISIÓN	308.832,84	
FISCALIZACIÓN	132.356,93	
AUDITORIA	132.356,93	
<b>TOTAL</b>	<b>9.397.342,26</b>	





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.
0287-66986-00000	CONST. PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO PORVENIR FASE I	2.850.648,55	270 días	FPS



# SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO



## ACTIVIDADES

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 002	PROGRAMA PREVENCIÓN VIGILANCIA - CAMPAÑA EPIDEMIOLOGIA BJO.	400.000,00	0,00	400.000,00	318.365,20	79,59

24 CONTRATOS POR SERVICIOS MANUALES (TÉCNICOS EN VECTORES)



2 CAMPAÑAS DE DESCHATARRIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE



COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) PARA GARANTIZAR FUMIGADO Y LAS CAMPAÑA DESCHATARRIZACION



- MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA.
- COMPRA DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA.



MATERIAL DE LIMPIEZA,  
ARTÍCULOS DE DESINFECCIÓN.



CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
DEL PROGRAMA (TÉCNICO DE  
FUMIGACIÓN Y OTROS)



- ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS.



- DOTACIÓN DE CHALECOS AL PERSONAL TÉCNICO DEL PROGRAMA.



- DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN.




## RESULTADOS (INFORMES ENTOMOLOGICOS)

DENGUE	GESTION 2021	GESTION 2022
SOSPECHOSOS	136	114
CONFIRMADOS	6	31



HANTAVIRUS	GESTION 2021	GESTION 2022
POSITIVOS	7 BERMEJO	4 (BERMEJO)
FALLECIDOS	0	1 IMPORTADO

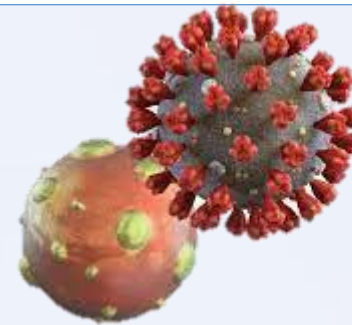

LEISHMANIASIS	GESTION 2021	GESTION 2022
CONFIRMADOS	21	9



MALARIA	GESTION 2021	GESTION 2022
CONFIRMADOS	0	0



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 006	FORTALICIMIENTO CENTRO DE ZONOSIS BERMEJO	45.000,00	0,00	45.000,00	25.708,08	57,13




- ❖ Adquisición de material servicios de imprenta, fotocopias de formularios en apoyo a Campaña de Rabia Canina desarrollado en el municipio de Bermejo.
- ❖ Se gestiona 2 campañas de vacunación contra la rabia canina y felina..
- ❖ Se apoyo compra productos químicos y farmacéuticos (jeringas) en apoyo a la campaña de Rabia Canina desarrollado en el municipio de Bermejo.

## RESULTADOS – GESTION 2022

OBJETIVOS CANES POR VACUNAR	Nº DE CANES VACUNADOS	%
16.891,00	15.072,00	89,23

**Numero de Canes Vacunados = 15.072,00**





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 010	IMPLEMENTACION POLITICAS SAFCI Y PROYECTO MI SALUD MCPIO. BJO.	12.031,00	0,00	12.031,00	6.392,00	53,13

## PROMOCION Y PREVENCIÓN

- FERIAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN.
- ATENCION MEDICAS DOMICILIARIAS .
- RASTRILLAJE Y CONTENCIÓN CONTRA EL COVID-19.
- ATENCION NIÑO, MUJER, CONTROL PRENATAL, ANTICONCEPCION , CARPETIZACION FAMILIAR.



- ❑ 17 MÉDICOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA EL PROGRAMA SAFCI QUE PRESTAN SERVICIOS EN 12 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BERMEJO.
- ❑ IMPLEMENTACIÓN DE 8 NUEVOS MÉDICOS SAFCI (6 MÉDICOS Y 2 ENFERMERAS)

- ❖ ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO.
- ❖ COMPRA DE IMPRESORA.
- ❖ SE APOYO A LA REALIZACIÓN DE FERIA DE SALUD EN EL MES DE JUNIO Y AGOSTO.


CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 012	APOYO FUNCIONAMIENTO BONO JUANA AZURDUY MCPIO. BJO.	12.032,00	0,00	12.032,00	11.991,50	99,66

<b>PROMOCION Y PREVENCION</b>	<b>GESTION 2022</b>
<b>ENTREGAS DE SUBSIDIO (MESES)</b>	<b>11</b>

- ❑ SUBSIDIO QUE BENEFICIA AL BINOMIO MADRE NIÑO, REALIZADOS EN EL MARCO DEL BONO JUANA AZURDUY A 105 MUJERES DEL MUNICIPIO DE BERMEJO DE BS. 300
- ❑ 3 MÉDICOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA EL PROGRAMA.
- ❑ BONO MADRE NIÑO - NIÑA “JUANA AZURDUY”, COMO INCENTIVO PARA LA MATERNIDAD SEGURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE CERO A DOS AÑOS DE EDAD.




- REALIZACIÓN DE ENTREGAS DE BONOS, SUBSIDIO Y MATERIAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ESTANTE METÁLICO Y OTROS.
- ADQUISICIÓN DE BANNERS.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 013	APOYO FUNCIONAMIENTO CERETROP	200.000,00	0,00	200.000,00	105.084,60	52,54



DETALLE
ANALISIS DE LABORATORIO
PROCESAMIENTO DE PRUEBAS
CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES ENDEMICAS



❖ **ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO, MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS GASTOS PARA GARANTIZAR EL CERETROP.**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 014	LEY DEL CANCER ELA RUIZ DE MORALES	382.178,00	0,00	382.178,00	179.180,00	46,88

DESCRIPCION	CANTIDAD
ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	11
TRATAMIENTOS A PACIENTES CON CÁNCER	1

SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA UN PACIENTE DURANTE 6 MESES CADA 21 DÍAS.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 017	FORTALEC. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL BERMEJO	202.325,00	0,00	202.325,00	160.737,06	79,44

MESES	TERAPIAS	MEDICINA
ENERO	103	2
FEBRERO	228	12
MARZO	354	0
ABRIL	332	0
MAYO	243	18
JUNIO	223	18
JULIO	206	26
AGOSTO	354	41
SEPTIEMBRE	356	19
OCTUBRE	326	39
NOVIEMBRE	390	55
DICIEMBRE	320	25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.435</b>	<b>255</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3690</b>	



DETALLE
GARANTIZAR LAS ATENCIONES INTEGRALES, TERAPIAS Y OTROS
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CENTRO DE REHABILITACION


- ADQUISICIONES EN MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO

- ❖ 5 Contratos de consultoría individual en línea del GAMB.
- ❖ cancelación de Servicio de Energía Eléctrica.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 022	FORTALEMIENTO RR.HH. ADM. BJO.	923.001,00	0,00	923.001,00	866.198,66	93,85

**PERSONAL ADMINISTRATIVO GESTION-2022  
29 CONTRATOS DEL G.A.M.B.**






CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 023	APOYO A CENTROS Y DIRECCION DE SALUD	626.806,00	202.500,00	829.306,00	687.096,24	82,85




- ❖ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIOS EN APOYO A LA DIRECCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMER NIVEL.
- ❖ ADQUISICIÓN DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES, FERIAS DE SALUD, CAPACITACIONES DE SALUD.
- ❖ SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LAS AMBULANCIAS Y MOTOCICLETAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.
- ❖ CANCELACIÓN DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LOS CENTROS DE SALUD
- ❖ ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES EN APOYO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DIFERENTES CENTROS.




❖ ENTREGA DE BLOCKS,  
RECETARIOS, MATERIAL DE  
LIMPIEZA Y ESCRITORIO.


❖ ENTREGA DE  
INSTRUMENTAL  
QUIRÚRGICOS,  
ESTERILIZADORES,  
GENERADOR DE  
OXIGENO, EQUIPOS  
DE COMPUTACIÓN.



- ❖ ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICOS: SILLÓN ODONTOLÓGICO.
- ❖ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SILLONES ODONTOLÓGICOS DE LOS CENTROS.



- ❖ CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 21 DE DICIEMBRE




# EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE SALUD

## 21 DE DICIEMBRE



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 024	FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD	400.000,00	0,00	400.000,00	393.452,90	98,36

**PERSONAL MEDICO-PARAMEDICO- TOTAL 52  
14 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL**



FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD	CANT.
ODONTOLOGOS	6
MEDICOS	9
ENFERMERAS	18
BIOIMAGENOLOGOS	1
AUX. EN ENFERMERIA	5
BIOQUIMICAS	6
QUIMICA - FARMACEUTICO	7
<b>TOTAL ITEMS POR 3 MESES</b>	<b>52</b>

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	CONTRATOS MEDICOS Y PARAMEDICOS
020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	8 MESES

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	3.608.106,00	3.816.714,66	7.424.820,66	5.547.378,19	74,71

### GASTOS PARA 14 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BERMEJO

#### LICITACION ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


- ❖ 1 LICITACION PUBLICA
- ❖ 2 ANPE

#### LICITACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.



**RESULTADOS RELEVANTES (SUS)**

**ESTABLECIMIENTO SIN RUPTURA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL 94%**



### GASTOS 14 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BERMEJO

MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE

ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIOS (CANCELACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD).

52 CONTRATOS DE MÉDICOS Y PARAMÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y DEPORTES.






CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
020 0 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	550.000,00	0,00	550.000,00	347.621,00	63,20

- ❖ SE DOTÓ DE COMBUSTIBLE CON EL OBJETO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE TRASLADO Y PREVENCIÓN, DESINFECCIÓN, FUMIGADO PARA EL COVID-19.
- ❖ SE REALIZARON LA CONTRATACIÓN DE 5 CONTRATOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL EN LÍNEA PARA REALIZAR LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LOS CASOS POR EL COVID-19.
- ❖ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (HELADERAS) Y MEDICAMENTOS E INSUMO COVID-19



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
022 0 005	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE MUNICIPAL BERMEJO	548.773,00	21.269,33	570.042,33	394.936,37	69,28

## CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA



■ ENCARGADO DE DEPORTES - 1

■ SERENOS CAMPOS DEPORTIVOS - 4

■ INSTRUCTORES ESCUELITAS 13 - ATLETISMO, AJEDREZ, BASQUET, BOXEO, CANOTAJE, FUTBOL, FUTSAL, FISICOCULTURISMO Y FITNESS, KARATE, NATACION, RAQUETA FRONTON, TAEKWONDO, VOLEIBOL.



# ESCUELITAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

**ATLETISMO**



**AJEDREZ**



**BASQUET**



**BOXEO**



**CANOTAJE**



**FUTBOL**



**FUTSAL**



**FISICOCULTURISMO Y F.**



**KARATE**



**NATAACION**



**RAQUETA FRONTON**



**TAEKWONDO**



**VOLEIBOL**



## GASTOS – FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEL DEPORTE

- **MATERIAL DE PREMIACION:** Entrega de trofeos, medallas y reconocimientos a los deportistas ganadores de los campeonatos municipales, vuelta del centauro, noche de campeones, en las diferentes disciplinas deportivas de la ciudad Bermejo,

**AJEDREZ**



**KARATE**



**FUTBOL**



**BASQUET**



**VOLEIBOL**



**BOXEO**



**RAQUETA FRONTON**



**ATLETISMO-VUELTA DEL CENTAURO**



**NOCHE DE CAMPEONES**



- **INDUMENTARIA DEPORTIVA:** Entrega de poleras y cortos, para los deportistas y el cuerpo técnico, que nos representaron como selección de Bermejo en campeonatos departamentales en la ciudad de Tarija, en diferentes disciplinas deportivas.

**FUTSAL**



**TAEKWONDO**



**BASQUET**



**VOLEIBOL**



**MOTOCICLISMO**



**KARATE**



**ATLETISMO**



**BOXEO**



**VOLEIBOL- SELECCIÓN BOLIVIANA**



- **ALIMENTOS Y OTROS SIMILARES:** Para el taller de capacitación “primeros auxilios”, para el campeonato departamental de fútbol de salón – liga oficial de clubes, realizado en la ciudad de Bermejo.

### PRIMEROS AUXILIOS



### VOLEIBOL- SELECCIÓN BOLIVIANA



### FUTBOL DE SALON



## CANCELACION DE DEUDA DE LUZ DEL ESTADIO MUNICIPAL

- Cancelación de deuda del servicio básico – energía eléctrica, del Estadio Municipal, campo deportivo del G.A.M.B. ubicado en el barrio municipal, deuda desde el año 2018, se cancelo un monto total de Bolivianos 44.109,50 (cuarenta y cuatro mil ciento nueve 50/100 Bolivianos)



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 005	APOYO REALIZACION JUEGOS PLURINACIONALES ESTUD. U.E. MPIO. DE BJO.	121.290,00	-21.290,00	100.000,00	14.770,00	14,77

## MATERIAL DEPORTIVO DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS .



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 006	APOYO REALIZACION OLIMPIADAS NIÑOS ESPECIALES U.E. SAN ANTONIO	23.178,00	0,00	23.178,00	0,00	0,00

DEBIDO A QUE NO SE HA LANZADO LA CONVOCATORIA NACIONAL NO SE REALIZO LAS OLIMPIADAS NIÑOS ESPECIALES POR LO CUAL NO SE EJECUTO EL PROGRAMA.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 009	TRANSPORTE ESCOLAR U.E. MUNICIPIO BJO.	398.439,00	0,00	398.439,00	294.340,00	73,87

RUTA N°	COMUNIDAD Y/O ZONA BENEFICIADA	TURNO	ALUM. BENEF.	DESTINO U.E.
01	NARANJITOS	MAÑANA	22	CAMPO GRANDE
02	TALITA, CAMPAMENTO LOS CEIBOS, COFADENA Y COTAGAITA	MAÑANA	41	CAMPO GRANDE
03	LOS POZOS, NARANJO DULCE ,FLOR DE ORO, CANDADO GRANDE, CANDADO CHICO	MAÑANA	26	25 DE MAYO, DIURNO BOLIVIA
04	LOS POZOS, NARANJO DULCE ,FLOR DE ORO, CANDADO GRANDE, CANDADO CHICO	TARDE	25	GUIDO VILLAGÓMEZ, MCAL ANDRÉS DE STA CRUZ.
05	SANTA ROSA	MAÑANA	25	CANDADO GRANDE, 25 DE MAYO.
06	QUEBRADA CHICA, ALTO CALAMA, FINCA LA ENVIDIA	MAÑANA	19	COLONIA LINARES
07	ALTO CALAMA, INGENIO, ARROZALES, 25 DE ENERO	MAÑANA	38	ARROZALES, LA ESPERANZA
08	CAMINO ANTIGUO A INGENIO, CAMINO AL CHORRO Y B° 2 DE AGOSTO	MAÑANA	29	EL NUEVE
09	PERALITOS NOGALITOS	MAÑANA	14	BARREDERO
10	U. E. LA ESPERANZA, PORVENIR, MERCADO SAN ANTONIO, SUB GOBERNACIÓN, MERCADO CAMPESINO, AVDA. ORURO, JUAN PABLO II, AVDA. PETROLERA, AVDA. BARRANQUERAS.	MAÑANA	18	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN ANTONIO
11	U. E. LA ESPERANZA, PORVENIR, MERCADO SAN ANTONIO, SUB GOBERNACIÓN, MERCADO CAMPESINO, AVDA. ORURO, JUAN PABLO II, AVDA. PETROLERA, AVDA. BARRANQUERAS.	TARDE	20	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN ANTONIO
12	CAMINOS ALEDAÑOS DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA HASTA LA U.E LA FLORIDA,	MAÑANA	20	LA FLORIDA
<b>TOTAL ESTUDIANTES BENEFICIADOS</b>			<b>297</b>	

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 010	FORTALECIMIENTO DIRECCION DISTRITAL	12.777,00	0,00	12.777,00	7.166,88	56,09



- ❖ SE REALIZÓ LAS ADQUISICIONES DE MATERIAL DE ESCRITORIO.
- ❖ SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
- ❖ CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (TELÉFONO E INTERNET) DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021 Y ENERO A ABRIL 2022.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 012	OLIMPIADAS CIENTIFICAS PLURINACIONALES	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00

DEBIDO A QUE NO SE HA LANZADO LA CONVOCATORIA NO SE REALIZO LAS OLIMPIADAS CIENTIFICAS PLURINACIONALES POR LO CUAL NO SE EJECUTO EL PROGRAMA.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 013	ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL BJO.	4.109.544,00	121.017,60	4.230.561,60	4.152.467,31	98,15

### DESAYUNO ESCOLAR AREA RURAL

Nº DE UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	22
N.º DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	1.521,00
TOTAL RACIONES	243.360,00
DIAS	160
MONTO	1.010.273,39
PREPARADO/PROVISTO	37 MANIPULADORAS
MODALIDAD	PREPARACION DEL DESAYUNO Y MERIENDA (PRODUCTOS SECOS Y COMPLEMENTARIOS)



### MENAJE DE COCINA DE COCINA (U.E. ÁREA RURAL)



### INDUMENTARIA DE COCINA E (U.E. ÁREA RURAL)



### COCINAS DE TRES HORNALLAS (U.E. DEL ÁREA RURAL).



### MATERIAL DE LIMPIEZA (U.E. ÁREA RURAL-ÁREA DE COCINA)




### DESAYUNO ESCOLAR AREA URBANA

Nº DE UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	21
Nº DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	8.012,00
TOTAL RACIONES	1.281.920,00
DIAS	160
MONTO	2.569.132,80
PREPARADO/PROVISTO	EMPRESA ADJUDICADA
MODALIDAD	PROVISION DE PRODUCTOS ENVASADOS (LIQUIDOS Y SECOS)



### CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA PARA REALIZAR LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL DESAYUNO ESCOLAR.



HORNOS INDUSTRIALES  
(U.E. AREA URBANA)



CANCELACIÓN DE  
SERVICIOS BÁSICOS (GAS  
DOMICILIARIO) DESDE EL  
MES DE NOVIEMBRE Y  
DICIEMBRE 2021 Y ENERO  
HASTA NOVIEMBRE 2022

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 018	PROGRAMA DE GABINETE PSICOLOGICO	153.431,00	0,00	153.431,00	110.639,10	72,11

SE REALIZÓ UN CAMINATA EN CONTRA EL BULLYING, CON TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANO.

SE COORDINÓ CON LA ONG VISIÓN MUNDIAL, PARA TRABAJAR EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

SE INAUGURÓ LA ESCUELA DE PADRES.

EN RECESO EDUCATIVO INVERNAL, SE VISITÓ DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES, DANDO TALLERES DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON TÍTERES, A LA VEZ SE DIO A LOS PADRES DE FAMILIA, LA TEMÁTICA COMO IDENTIFICAR INDICIOS, SI UN NIÑO O NIÑA ESTA SUFRIENDO ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL.



450 ATENCIONES DE FORMA INDIVIDUAL A ALUMNOS Y ALUMNAS Y SUS PADRES, DEL ÁREA URBANA.

60 ATENCIONES DE FORMA INDIVIDUAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS Y SUS PADRES DEL ÁREA RURAL.

350 PADRES DE FAMILIAS SE BENEFICIARON CON LOS DIFERENTES TALLERES (CRIANZA CON TERNURA, IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS DEL ABUSO SEXUAL)

2000 ALUMNOS, ALUMNAS SE BENEFICIARON CON TALLERES DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN, TANTO DEL NIVEL; KÍNDER, PRIMARIO Y SECUNDARIO, ÁREA URBANO Y RURAL.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 020	CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA U.E. BERMEJO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00

U.E. KINDER TARIJA  
TURNO MAÑANA Y  
TARDE

U.E. OCTAVIO  
CAMPERO ECHAZU  
NIVEL PRIMARIA

U.E. SIMON BOLIVAR

U.E. ANTONIO JOSE DE  
SUCRE

U.E. 25 DE MAYO

U.E. GUIDO  
VILLAGOMEZ

U.E. BOLIVIA DIURNO

U.E. EDUARDO  
AVAROA

U.E. MCAL ANDRES DE  
SANTA CRUZ

U.E. OCTAVIO  
CAMPERO ECHAZU II

U.E. COLONIA LINARES

U.E. AULIO ARAOZ



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 024	REVOLUCION- _TECNOLOGICA EN EDUCACION	33.091,00	0,00	33.091,00	0,00	0,00


DEBIDO A QUE NO FUE APROBADA LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO SE PUDO REALIZAR LA CANCELACION DE LA DEUDA TOTAL DE LAS QUIPUS.


CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 034	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO UNIDADES EDUCATIVAS BERMEJO	220.143,00	0,00	220.143,00	158.785,90	72,13

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS.




COMPRA E INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS.





COMPRA DE  
MATERIAL DE  
ESCRITORIO.



COMPRA DE  
REPUESTOS Y  
ACCESORIOS.


CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 035	FORTALECIMIENTO UNIDAD EDUCACION Y UNIDADES EDUCATIVAS	672.821,00	0,00	672.821,00	659.374,35	98,00

# COMPRAS



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 036	ADQUISICION Y DOTACION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN BERMEJO	348.453,00	0,00	348.453,00	332.196,57	95,33

<b>COMPRA DE :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MATERIAL DE PAPEL</li> <li>2. MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA</li> <li>3. MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE (BIOSEGURIDAD).</li> </ol>
<b>MONTO</b>	284.827,57 Bs.
<b>BENEFICIARIOS</b>	<p>20 U.E. DEL AREA RURAL</p> <p>22 U.E. DEL AREA URBANA</p>



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 037	FORTALECIMIENTO ITEMS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES EN MUNICIPIO DE BERMEJO	492.606,00	0,00	492.606,00	488.251,84	99,12

## ITEMS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS

17 CONSULTORES INDIVIDUAL DE LINEA CONTRATADOS:

- 6 NIÑERAS
  - 5 PORTERAS
  - 4 REGENTE
  - 2 SECRETARIA,
- PARA EL SUBSISTEMA REGULAR DEL AREA URBANA.

## ITEMS MUNICIPALES DOCENTES

11 CONSULTORES INDIVIDUAL DE LINEA CONTRATADOS:

- ✓ 4 PARA EL SUBSISTEMA REGULAR AREA URBANA
- ✓ 1 SUBSISTEMA REGULAR AREA RURAL
- ✓ 6 PARA EL SUBSISTEMA ESPECIAL Y ALTERNATIVO.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
021 0 038	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	40.290,00	95,93

## MATERIAL E INDUMENTARIA DEPORTIVA

I  
N  
T  
E  
R  
N  
U  
C  
L  
E  
O  
S

CAMPO GRANDE



COLONIA LINARES




CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 001	FORTALECIMIENTO UNIDAD DE CULTURA	33.084,00	0,00	33.084,00	27.843,89	84,16

❖ SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CULTURA, PARA REALIZAR TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE BERMEJO.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 002	DESARROLLO ACTIVIDADES DE CULTURA Y ARTE MCPIO. BJO.	150.824,00	90.000,00	240.824,00	131.535,00	54,62

ANIVERSARIOS DE BARRIOS  
Y COMUNIDAD



ACTIVIDADES  
ESTUDIANTILES



ACTIVIDADES CULTURALES



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 003	FORTALICIMIENTO A ESCUELA DE MUSICA Y DANZA MUNICIPIO BJO.	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00	0,00

**DEBIDO A QUE NO SE APERTURO LAS ESCUELITAS MUNICIPALES NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO.**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 004	REALIZACION FESTIVAL DE LAPACHO LEY 2925	34.969,00	0,00	34.969,00	0,00	0,00

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 005	FESTIVAL PATRONAL SAN SANTIAGO LEY 3393	19.453,00	0,00	19.453,00	16.500,00	84,82



- ❖ SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES Y ACADEMIAS DE DANZAS.
- ❖ SE REALIZO LA COMPRA DE MONTURAS.

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
023 0 006	ANIVERSARIO FUNDACION MUNICIPIO BJO.	22.895,00	240.849,80	263.744,80	227.844,80	86,39

- ❖ SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES NACIONALES, INTERNACIONALES Y LOCALES.
- ❖ SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE ACADEMIAS DE DANZAS.
- ❖ SE REALIZO LA CORONACIÓN DE LA REINA DEL CENTENARIO 2022.
- ❖ SE REALIZO EL DESFILE CÍVICO CON PRESENCIA DE AUTORIDADES INVITADAS.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
025 0 001	SERVICIO A LA ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	199.210,00	0,00	199.210,00	125.915,40	63,21

### CASOS ATENDIDOS CON INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL

CASOS	CASOS ATENDIDOS
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	59
VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	3
VIOLACIÓN	2
ORIENTACIÓN Y/O APOYO INTEGRAL	501
INFORMES SOCIALES	43
ASESORAMIENTO LEGAL	41
INFORMES PSICOLÓGICOS	65
TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y CONTENCIÓN EMOCIONAL	206
<b>TOTALES</b>	<b>920</b>



CASOS	TOTAL
Renovación de Carnet de Discapacidad	187
Derivación de casos a INTRAID	7
Trámite para duplicar Carnet de Discapacidad	7
Recepción de documentación para renovación y sacar un carnet nuevo de discapacidad.	180
Visitas Domiciliarias	80
Capacitación para fortalecer Nuestro Conocimientos	2
<b>TOTAL</b>	<b>463</b>

APOYO DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE LA PCD, PARA LA GESTIÓN DEL **CARNET DE DISCAPACIDAD.**

### INFORMES PSICOSOCIALES DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD:

AYUDAS TECNICAS	CANTIDAD	PERSO NAS BENIFE CIARIOS
SILLAS DE RUEDAS	10 UNIDADES	<b>25 PCD</b>
MULETAS CANADIENSES	2 UNIDAD	
COLCHONES ANTIESCARAS	5 UNIDADES	
COJÍN DE GOMA ESPUMA	7 UNIDADES	
ANDADOR DE DOS RUEDAS (BURRITO)	1 UNIDAD	



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
025 0 002	SERVICIO MUNICIPAL A LA ATENCION ADULTO MAYOR	116.402,00	0,00	116.402,00	79.321,80	68,14

- ❖ LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR CUENTA CON 3 PROFESIONALES:
  - 1.- PSICÓLOGA (CONSULTOR EN LÍNEA)
  - 2.- ASESORA LEGAL (CON ÍTEM)
  - 3.- PROMOTOR SOCIAL (CON ÍTEM)
- ❖ SE BRINDO ATENCIÓN LEGAL, PSICOLÓGICO Y SOCIAL, CON INTERVENCIONES LEGALES, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL, DENTRO Y FUERA DE OFICINAS BENEFICIANDO A LOS ADULTOS MAYORES.
- ❖ SE REALIZO LAS INTERVENCIONES PSICOSOCIALES EN SUS DOMICILIOS A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA EL APOYO RESPECTIVO.
- ❖ SE REALIZO LA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRADORA CASA HOGAR PADRE LUIS PORTILLO Y LA INTERVENCIÓN PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES SEAN INGRESADOS AL ASILO.
- ❖ TOTAL DE ATENCIONES SOCIAL **781** TOTAL DE ATENCIONES PSICOLOGICOS **229** TOTAL ATENCIONES ASESORIA LEGAL **292**.







- ❖ PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO LOCAL O NACIONAL.
- ❖ ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA ASOC. LA FRONTERA PARA LA REALIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DÍA DEL ADULTO MAYOR EN LA CASA DE LA CULTURA.
- ❖ ATENCIÓN EN OFICINAS ATENDIENDO DIFERENTES PROBLEMÁTICAS EN BENEFICIO A LOS ADULTOS MAYORES.
- ❖ SEGUIMIENTO A DIFERENTES COMUNIDADES POR DIFERENTES PROBLEMÁTICAS Y EN ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN SOLAS Y EN SITUACIÓN PRECARIA.
- ❖ SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 1886, DESCUENTO DEL 20% DEL PASAJE DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL, CON LAS EMPRESAS DE LA TERMINAL DE BUSES.
- ❖ PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIAS EN LAS COMUNIDADES POR TEMAS DE TERRENOS.

## ATENCIÓN DE CASOS AREA SOCIAL

TIPOLOGIA	CASOS NUEVOS (ENERO- JUNIO)	CASOS NUEVOS (JULIO- SEPTIEMBRE)	CASOS NUEVOS (OCTUBRE- DICIEMBRE)	TOTAL CASOS ATENDIDOS
LLENADO DE REGISTRO PARA LA HABITACION DE CARPETAS	228	142	135	565
ATENCIÓN DE CASOS DE DIFERENTES PROBLEMÁTICAS: HERENCIAS, PROBLEMAS ENTRE HNS, ENOJOS ENTRE PAREJAS, CELOS, AYUDA PARA SACAR C.I., ETC.	91	59	63	213
INFORME SOCIAL PARA DENUNCIA E VIOLENCIA PSICOLOGICA	6	2	2	13
INFORME SOCIAL PARA DENUNCIA DE VIOLENCIA FISICA	1	-	5	3
INFORMES SOCIALES DE REQUERIMIENTO FISCALES	10	6	2	21
INFORMES PARA INGRESO AL ADULTO MAYOR A LA CASA HOGAR LUIS PORTILLO	2	1	126	5
ENTREGA DE CITACIONES A DOMICILIO	193	50	65	369
SEGUIMIENTO CASOS ANTIGUOS	95	85	10	245
ACOMPañAMIENTO A SEGIP, REGISTRO CIVIL, CANASTA ALIMENTARIA.	20	15	26	45
ORIENTACION DE ACCION	30	20	8	76
ATENCIÓN EMERGENCIA HOSPITAL	20	1	17	5
INFORMES SOCIALES	15	13	-	45
<b>TOTALES</b>				<b>1605</b>

**ATENCIÓN DE CASOS PSICOLÓGICOS**

TIPOLOGIA	CASOS NUEVOS (ENERO- JUNIO)	CASOS NUEVOS (JULIO- SEPTIEMBRE)	CASOS NUEVOS (OCTUBRE- DICIEMBRE)	TOTAL CASOS ATENDIDOS
ORIENTACION PSICOLOGICAS	40	13	35	88
INFORME PARA DENUNCIA DE VIOLENCIA PSICOLOGICA	6	2	5	13
INFORME PARA DENUNCIA DE VIOLENCIA FISICA	1	-	2	3
INFORME DE REQUERIMIENTO FISCALES	10	6	7	20
TERAPIAS PSICOLOGICAS CON REQUERIMIENTO FISCAL	-	-	-	5
INFORMES PARA EL INGRESO A LA CASA HOGAR LUIS PORTILLO	-	-	-	333
SEGUIMIENTO DE CASOS	66	16	40	122
REPRESENTACIONES DE REQUERIMIENTO FISCALES	2	-	5	7
APOYO A SLIM CON INFORMES PSICOLOGICOS C/ REQUERIMIENTO	9	8	6	23
TERAPIAS PSICOLOGICAS CON REQUERIMIENTO FISCAL	13	6	10	29
TERAPIAS PSICOLOGICAS CON REQUERIMIENTO FISCAL DE SLIM	8	5	6	19
APOYO A SLIM CON INFORMES PSICOLOGICOS PARA DENUNCIA	1	-	-	1
APOYO A DNNA	4	-	2	6
<b>TOTALES</b>				<b>669</b> 187

## ATENCIÓN DE CASOS LEGALES

TIPOLOGIA	CASOS NUEVOS (ENERO- JUNIO)	CASOS NUEVOS (JULIO- SEPTIEMBRE)	CASOS NUEVOS (OCTUBRE- DICIEMBRE)	TOTAL CASOS ATENDIDOS
ASESORAMIENTO LEGAL OFICINA	102	80	96	278
CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PÚBLICO	7	2	5	14
CASOS EN PROCESO DE SENTENCIA	2	2	4	8
AUDIENCIAS INTERNAS EN OFICINA	45	20	37	102
ACTAS DE ACUERDOS	5	5	7	17
AUDIENCIAS VIRTUALES MEDIDAS CAUTELAR Y POR PROCESOS PARA SENTENCIA	5	3	3	11
AUDIENCIAS PRESENCIALES JUZGADO	1	2	1	4
JUCIO ORAL	3	-	-	3
CASOS DE PROCESOS CONCLUIDOS	3	1	3	7
ACOMPañAMIENTO A REGISTRO CIVIL, SERECI.	4	-	6	10
<b>TOTALES</b>				<b>454</b>

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
025 0 004	FORTALECIMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL	28.294,00	0,00	28.294,00	23.849,70	84,29

### COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL

- REALIZAR LA COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL EN DIFERENTES UNIDADES.
- COORDINACIÓN ACTIVA CON LAS DIFERENTES UNIDADES BAJO DEPENDENCIA PARA REALIZAR UN TRABAJO INTEGRAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS VULNERABLES.
- SEGUIMIENTO CONTINUO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN DIFERENTES UNIDADES DEL ÁREA SOCIAL QUE SE ENCUENTRAN BAJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PARA QUE SE BRINDE BUENA ATENCIÓN DE CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACUDE A UNIDADES COMO DNA, SLIM, UMAPDIS, ADULTO MAYOR , CENTROS CENTIR TIPO II.

### COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

- REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL CONVOCADA POR VISIÓN MUNDIAL - PLAN DE TRABAJO 2022 CON TODO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
- VISIÓN MUNDIAL - SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y CUALQUIER OTRO TIPO DE VIOLENCIA
- VISIÓN MUNDIAL – ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PAR ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA
- MESAS INFORMATIVAS INTERINSTITUCIONALES ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER
- VISIÓN MUNDIAL - REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
025 0 005	SERVICIO LEGAL INTEGRAL SLIM MUNICIPIO BJO.	246.477,00	0,00	246.477,00	230.421,77	93,49
025 0 060	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES ( SLIM )-IDH D.S. 2145	103.523,00	0,00	103.523,00	78.082,53	75,43

- ACTIVARON 1 EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIO MAS AL SLIM: UNA ASESORA LEGAL, PROMOTOR SOCIAL Y PSICÓLOGA Y ASÍ SE PERMITIO LLEGAR A LUGARES ALEJADOS Y ÁREAS DISPERSAS DEL ÁREA RURAL.
- 8 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
- 5 FERIAS CON OTRAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN POR EL SECTOR COMO VISIÓN MUNDIAL, SEDEGES, CRUZ ROJA, POLICÍA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 348,.
- 1 FESTIVAL DE PREVENCIÓN Y CONCIERTIZACION DE LA NO VIOLENCIA.

### ACTIVIDADES

- ✓SE EJECUTARON 3228 ATENCIONES EN EL AREAS DE PSICOLOGÍA, LEGAL Y SOCIAL, EN 8 MESES
- ✓SE CONCRETARON 303 DENUNCIAS AL MINISTERIO PUBLICO.
- ✓SE EJECUTARON 510 INTERVENCIONES LEGALES EN PROCESOS PENALES POR VIOLENCIA FAMILIAR.
- ✓510 ORIENTACIONES A LOS USUARIOS/AS QUE SE APERSONAN ENTRE ELLOS POR CONFLICTO DE PAREJA (COMUNICACIÓN E INFIDELIDAD), CONFLICTO ENTRE PARTES (INTERESES PERSONALES POR HERENCIA Y REPARTICIÓN DE BIENES O POR PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO.

TALLERES	COMUNIDAD
SOCIALIZACION DE LA LEY 348	COLONIA LINARES
SOCIALIACION DE LA LEY 348	PORCELANA
SOCIALIZACION DE LA LEY 348	CAMPO GRANDE



SOCIALIZACION DE LA LEY 348	BARRIO ASENTAMIENTO VICTOR PAZ
SOCIALIACION DE LA LEY 348	CANDADO GRANDE
FERIA DE LA SOCIALIZACION DE LA LEY 348	FLCV



SOCIALIZACION DE LA LEY 348	1er FESTIVAL PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LA NO VIOLENCIA
-----------------------------	--



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
025 0 089	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	978.000,00	0,00	978.000,00	797.500,00	81,54

EN LA GESTIÓN SE **BENEFICIO POR MES A APROX. 293** PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON UN PAGO MENSUAL DE BS. 250, SIGNIFICANDO UNA EROGACIÓN DE **BS. 797.500.- DE 12 MESES (DIC/2021 A NOV/2022)**

LEY N° 977 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES, ES RESPONSABILIDAD EL PAGO DE UN BONO MENSUAL DE BS250.-, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, QUE TENGAN ACREDITADO LEGALMENTE SU DOMICILIO EN SU RESPECTIVA JURISDICCIÓN, EL MENCIONADO PAGO SERÁ EFECTUADO CONFORME EL PARÁGRAFO I DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO SUPREMO N° 3437 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA EUSTAQUIO - MOTO - MENDEZ AL 30 DE JUNIO DE CADA GESTIÓN FISCAL,



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
026 0 001	FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	298.999,00	0,00	298.999,00	243.516,29	81,44

## ACTIVIDADES


**ATENCION DE CASOS:** Se tiene 994 atenciones, debido aun a consecuencias de pandemia la afluencia a acudir a la DNA aun no es normal.

**TALLERES:** Durante el primer trimestre se pudo realizar 8 talleres en las unidades educativas sobre PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN Unidades Educativas del area dispersa y algunos de esta ciudad.

**Operativo de Control de Viaje:** Se hizo 8 operativos de control de viaje en el Puente internacional y en la terminal.

**PERMISO DE VIAJE:** Se dio 253 Permiso de Viaje hasta el Mes de Diciembre se hizo.

## ATENCION DE CASOS 2022 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



- PROCESOS PENALES 88
- ASISTENCIA FAMILIAR 192
- ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL 4
- OTROS 36

### **GASTOS - FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**

TRABAJOS DE ATENCION Y  
SEGUIMIENTO A VICTIMAS.

OPERATIVOS DE CONTROL  
INTERINSTITUCIONAL DE VIAJES DE  
MENORES DE EDAD. (MIGRACIONES,  
INTERPOL)

REUNIONES DE COORDINACION  
INTERINSTITUCIONAL - HOGAR HEYDI  
SEDEGES



### **GASTOS - FORTALECIMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**

TALLERES DE PREVENCION CON  
UNIDADES EDUCATIVAS.

TALLERES, DE SOCIALIZACION,  
INFORMACION Y CONCIENTIZACION.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
026 0 003	PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION CENTROS INFANTILES TIPO II	298.436,00	-7.425,27	291.010,73	15.828,04	5,44

- LA APERTURA DE LOS CENTROS, SE VIO SUSPENDIDA ANTE LA CONTINUIDAD DE LA PANDEMIA POR COVID 19 DURANTE LA GESTIÓN 2022.
- SE PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA).

# SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO



**ACTIVIDADES**

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
033 0 001	APOYO PORGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	120.880,00	0,00	120.880,00	74.495,00	61,63

DESCRIPCION	TOTAL
<b>CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA</b>	<b>38.502,00</b>
Por concepto de Consultor de línea para la Unidad por 9 Meses	29.169,00
Canc. por concepto de Consultor de línea de la gestión 2020 3 Meses	9.333,00
<b>PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS</b>	<b>3.555,00</b>
<b>VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS</b>	<b>1.320,00</b>
<b>PAPEL</b>	<b>1.311,00</b>
<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICO</b>	<b>11.300,00</b>
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>	<b>1.497,00</b>
<b>GASTOS POR ALIMENTACION</b>	<b>17.010,00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO HASTA 31/12/22</b>	<b>74.495,00</b>
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>120.880,00</b>
<b>TOTAL SIN EJECUTAR</b>	<b>46.385,00</b>





CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
033 0 002	PROGRAMA DEL SEGURIDAD CIUDADANA LEY 264	362.331,00	0,00	362.331,00	326.047,66	89,99

DESCRIPCION	TOTAL
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>31.662,25</b>
Agosto – Diciembre 2021	7.203,50
Enero – Diciembre 2022	24.458,75
<b>AGUA</b>	<b>9.186,41</b>
Marzo – Diciembre 2021	2.687,71
Enero – Diciembre 2022	6.498,70
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS</b>	<b>14936</b>
<b>PAPEL</b>	<b>14.880,00</b>
<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (45.800 LITROS GASOLINA) 7835</b>	<b>179.472,00</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	<b>9.984,00</b>
<b>PAPEL</b>	<b>14.880,00</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>14.892,00</b>
<b>LLANTAS</b>	<b>17.620,00</b>
<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>	<b>6.999,00</b>
<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>16.416,00</b>
<b>TOTALEJECUTADO HASTA 31/12/22</b>	<b>326.047,66</b>
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>362.331,00</b>
<b>TOTAL POR EJECUTAR</b>	<b>36.283,34</b>







CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
033 0 080	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	51.762,00	0,00	51.762,00	29.653,00	57,29

DESCRIPCION	TOTAL
PAPEL	3.495,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	4.637,00
UTILES DE ESCRITORIO	3.581,00
MUEBLES	12.990,00
HELADERA	4.950,00
<b>TOTAL EJECUTADO HASTA 31/12/22</b>	<b>29.653,00</b>
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>51.762,00</b>
<b>TOTAL SIN EJECUTAR</b>	<b>22.109,00</b>

## SECRETARIA GENERAL

Organización y Planificación de la Agenda del Centenario.

Coordinación con ONU HABITAT presentación de la Nueva Agenda Urbana de Bermejo

2 Reuniones del COEM, para tratar evaluación y nuevas medidas de prevención COVID-19

Apoyo al Ejecutivo para firma de adendas de Convenio 21/18 con la Gobernación y 1 ampliación del Convenio con SETAR

- Coordinación con Secretarías, Direcciones del GAMB y con las entidades cívicas y Sociales
- Representar al Alcalde en diferentes reuniones

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
034 0 004	FORTALECIMIENTO DIRECCION PLANIFICACION	141.127,00	41.124,83	182.251,83	171.804,80	94,27

## RESULTADOS LOGRADOS

- 4 Eventos Internos de Evaluación a programas, Proyectos y Actividades ejecutados por las dif. Unidades al primer y segundo 2022
- 1 Cumbre de rendición de Cuenta Gestión 2021
- 1 Informe de compatibilización y concordación del PTDI y PEI ajustado 2021-2025
- 1 Taller para Formulación de Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2025
- 2 Talleres de Capacitación para Formular el POA de la gestión 2023, socialización mediante cumbre 30 de Agosto del 2022
- 16 Modificaciones Intrainstitucionales, interinstitucional presentadas al Concejo Municipal
- 3 Normativas Elaborados (1 Manual de Cierre de Proyectos de Inversión, 1 Manual de Funciones y 1 Manual de Cargos)
- 11 Monitoreo de la gestión de los programas y proyectos y su articulación con los sistemas SISIN WEB – SIGEP
- Realizar el seguimiento a instrumentos de planificación emitidos por el órgano rector

CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
34-0-005	FORTALECIMIENTO UNIDAD AUDITORIA INTERNA	78.374,00	0,00	78.374,00	48.812,80	62,28%


CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
034 0 008	FORTALECIMIENTO UNIDAD PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	200.841,00	80.000,00	280.841,00	217.957,39	77,61

- La dirección de Protocolo y Comunicaciones administra el perfil de Facebook del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, el cual remite las actividades de las Secretarías y Direcciones del GAMB
- Se contrato a 16 medios de comunicación
- Se provee de información a la Unidad de Informática, para la pagina Web del GAMB próxima a ser publicada en línea.



CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
034 0 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS)	21.731,00	0,00	21.731,00	7.700,00	35,43

# OTROS GASTOS POR LEY



**ACTIVIDADES**



N°	CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
1	021 0 088	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	29.578,00	8.134,07	37.712,07	37.712,07	100,00
2	025 0 088	RENTA DIGNIDAD	4.436.706,00	1.220.107,00	5.656.813,00	5.656.812,66	100,00
3	034 0 088	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	93.112,00	30.445,63	123.557,63	114.149,10	92,39
4	035 0 003	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION LOCAL	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
5	097 0 001	PROVISION GASTOS CAPITAL	1.796.891,00	809.065,41	2.605.956,41	0,00	0,00
6	097 0 050	TRANSFERENCIAS FDI	0,00	902.512,53	902.512,53	0,00	0,00
7	097 0 100	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	0,00	1.325.894,39	1.325.894,39	0,00	0,00

## ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA

De acuerdo al Decreto Supremo N° 859 de 29 de abril de 2011, los Gobiernos Autónomos Municipales beneficiarios de los recursos de coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, deben asignar el **0,2% de estos recursos al Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica**, debiendo programar el gasto, Actividad 88 "Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica"

- **ASIGNACIÓN PARA EL PAGO DE LA RENTA DIGNIDAD**
- Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de la Ley N° 3791 del 28 de noviembre de 2007, deben asignar el **30% de los recursos de coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos** para programar el pago de la Renta Dignidad en la partida presupuestaria 73100 “Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones, Actividad 88 "Renta Dignidad".

### **ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL**

Según la Ley N° 540 de 25 de junio de 2014, de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal, los Gobiernos Autónomos Municipales asociados al Sistema Asociativo Municipal deberán aportar anualmente el **4 (cuatro) por mil de sus recursos de coparticipación tributaria a la Federación de Asociaciones Municipales**; Actividad 88 “Sistema Asociativo Municipal”,

# CONCEJO MUNICIPAL



## ACTIVIDADES

N°	CAT. PROG.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUP. INIC.	MODIF. APROB.	PRESUP. VIG.	EJECUC. FIN. 31 DIC.	%
1	001 0 001	CONCEJO MUNICIPAL BERMEJO	1.725.499,00	-9.728,00	1.715.771,00	1.641.272,15	95,66
2	034 0 024	FORTALECIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	70.000,00	45.000,00	115.000,00	86.531,64	75,24
